



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

RAPORTUL

de evaluare intermediară a Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025



cu suportul

DCAF

Centrul de la Geneva
pentru Guvernarea
Sectorului de Securitate

finanțat de



Suedia
Sverige

2025

Ministerul Afacerilor Interne
mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare, 75
tel. +373(22) 255 830, e-mail: secretariat@mai.gov.md,
pagina web: www.mai.gov.md

1. Sumarul executiv:

Raportul curent are ca obiect al evaluării progresul în implementare, în perioada 2022-2023, a Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.846/2022 (*în continuare - Programul*). Raportul este parte a unui exercițiu de evaluare intermediară a progresului înregistrat în perioada anilor 2022-2023 în implementarea tuturor celor șase programe sectoriale privind subdomeniile de competență ale MAI, care sunt parte a Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030.

Programul a fost elaborat în baza unui concept axat pe exemplul Mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, care este format din trei componente principale: prevenire, pregătire și răspuns la situații de urgență și excepționale și indică direcția de dezvoltare a țării în domeniul gestionării situațiilor de urgență și excepționale.

Obiectivele de dezvoltare ale prezentului Program sunt raliat la obiectivele vizând prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență din Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030, care se referă la consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență și excepționale, eficientizarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale, modernizarea sistemului național de pregătire pentru situații de urgență și excepționale, sporirea capacității operaționale și de răspuns în situații de urgență și excepționale.

Programul a vizat toate cele 4 obiective generale, inclusiv obiectivele specifice, acțiunile și produsele planificate. Gradul de realizare a acestora a fost apreciat în baza unei metodologii unice având ca referință indicatorii de impact, de rezultat și de monitorizare stabiliți prin Hotărârea Guvernului.

Aspectele calitative și cantitative privind rezultatele obținute în procesul de implementare

În urma evaluării intermediare s-a constatat că la finele anului 2023, **75% din cei 4 indicatori de impact au atins țintele stabilite** pentru mijlocul perioadei de implementare, iar celelalte 25% s-a situat sub valorile planificate. Astfel, pentru 1 din cele 4 obiective generale au fost atinși indicatori de impact în **întârziere** față de țintele stabilite.

Rata de implementare a indicatorilor de rezultat privind cele 13 de obiective specifice constată că, în anul 2023 s-a înregistrat o devansare a valorilor înregistrate în vederea implementării a 1 obiectiv specific (7,7%), întârzieri de realizare a indicatorilor privind 2 obiective specifice (15,4%), fără progres au fost evaluate 2 obiective specifice (15,4%). Astfel, doar 69,2% din rezultate au fost realizate conform planului sau au depășit indicatorii planificați.

Astfel, la finele anului 2023, nivelul de realizare a indicatorilor de monitorizare aferenți Planului este următorul:

- 10 - realizați - **12,4 %**;
- 50 - în proces de realizare – **61,7%**;
- 14 - neinițiați – **17,3%**;
- 6 - nerealizați (cu progres avansat) - **7%**;
- 1 - nerealizat (fără progres) – **1,2%**.

Concluzii

Întru realizarea prevederilor Programului menționat au fost întâmpinate atât eficiențe, cât și dificultăți pentru realizarea obiectivelor generale și specifice, după cum urmează:

- unul din riscurile identificate fiind lipsa alocățiilor resurselor financiare necesare pentru implementarea acțiunilor planificate;
- lipsa unei conlucrări cu Ministerul Sănătății privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor de intervenție în timpul efectuării misiunilor de acordare a asistenței medicale urgente și primului ajutor;
- tergiversarea unor acțiuni, lipsa avizării unor acte normative eliberate de subdiviziunile/ministerele, precum și existența unor obiecții și reticență, domeniilor atribuite.

Recomandări principale

Îmbunătățirea implementării obiectivelor Programului în următoarea perioadă fiind necesar de a fi întreprinse următoarele activități:

- revizuirea acțiunilor planificate întru realizarea prevederilor stabilite în termenul specificat, cu includerea acestora în actele de planificare pentru ulterioara perioadă strategică;
- ajustarea și îmbunătățirea cadrului normativ, care va permite reglementarea activității în domeniile prevenirii, pregătirii și răspunsului în situații de urgență și excepționale;
- interacțiunea și consolidarea capacităților comune cu autoritățile administrației publice locale și centrale în domeniul gestionării situațiilor de urgență și excepționale;
- planificarea bugetară anuală a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și identificarea și accesarea surselor externe de finanțare pentru realizarea integrală a activităților planificate.

2. Introducere.

În perioada iulie-septembrie 2024, Ministerul Afacerilor Interne (*în continuare* - MAI) și subdiviziunile subordonate au desfășurat o evaluare intermediară a progresului în implementarea Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030 și a celor șase programe sectoriale privind subdomeniile de competență ale MAI pentru anii 2022-2025.

Acest raport prezintă rezultatele evaluării intermediare pentru anii 2022-2023 a Programului și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.846/2022, realizată în conformitate cu prevederile subpunctului 2 al punctului 3 din Hotărârea nominalizată.

În Program sunt evidențiate aspecte ce se referă la consolidarea capacităților de prevenire, pregătire, operaționale și de răspuns atât ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (*în continuare – IGSU al MAI*) în calitate sa de entitate de specialitate, cât și ale altor actori cu atribuții în domeniu, care sunt parte a sistemului național de protecție civilă.

Ministerul Afacerilor Interne elaborează și prezintă rapoarte de monitorizare a Programului, iar ministerele și instituțiile cu competențe în domeniu, prezintă la solicitare informații și datele necesare pentru asigurarea monitorizării eficiente a Programului și a planului de acțiuni privind implementarea Programului.

Programul include 4 obiective generale, care derivă din Strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030 și contribuie direct la realizarea obiectivelor și indicatorilor de evaluare ai Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”:

1. Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență și excepționale.

2. Eficientizarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale.

3. Modernizarea sistemului național de pregătire pentru situații de urgență și excepționale.

4. Sporirea capacității operaționale și de răspuns în situații de urgență și excepționale.

Cele 4 obiective generale sunt susținute de 13 de obiective specifice, iar intervențiile din Planul de acțiuni prevăd 63 de acțiuni și 81 de produse planificate (*indicatori de monitorizare*) pentru cei patru ani de implementare, dintre care 9 de produse au avut ca termen de livrare anii 2022-2023.

Prezentul Raport de evaluare intermediară are drept **scop** înțelegerea progresului înregistrat în implementarea Planului de acțiuni al Programului, având ca obiectivele cheie următoarele aspecte:

- analiza progresului general realizat în implementarea Obiectivelor stabilite și de a identifica domeniile în care s-au înregistrat progrese sau unde există discrepanțe între obiectivele propuse și rezultatele obținute;

- identificarea eventualelor îmbunătățiri necesare privind designul și implementarea programului;

- furnizarea de indicii pentru alocarea resurselor;

- servirea drept instrument pentru planificarea și luarea deciziilor în ceea ce privește acțiunile viitoare de îmbunătățire a implementării Planului de acțiuni al Programului;

- identificarea modelelor de bună practică ce pot fi diseminate și utilizate în programele viitoare.

Astfel, **evaluarea** intermediară prezintă modul în care Programul a funcționat până în prezent și dacă acesta va atinge obiectivele stabilite. Evaluarea intermediară însă, nu va oferi o imagine completă a rezultatelor și impactului Programului, deoarece perioada de la începutul implementării este insuficientă. Evaluarea intermediară va cuprinde recomandări privind modul în care se intenționează a se

aborda problemele/obstacolele identificate, pentru a asigura minimizarea impactului lor în a doua jumătate a perioadei de implementare a Programului.

Metodologia de evaluare utilizată

Evaluarea intermediară a Programului a fost desfășurată în câteva etape, pentru fiecare etapă fiind stabilite metode de colectare, procesare și redare a informației și datelor acumulate.

I. Colectarea informației.

Această etapă a fost realizată în luna iulie 2024 și a presupus mai multe metode de colectare a informației: solicitarea datelor și informațiilor de la instituțiile și autoritățile responsabile de implementare, privind progresul în implementarea Programului în perioada anilor 2022-2023; accesarea datelor statistice și a documentelor relevante care reflectă evoluții privind indicatorii evaluați; accesarea sondajelor sociologice; observare directă a produselor și rezultatelor generate.

II. Analiza, verificarea și interpretarea informației.

Această etapă a fost realizată în perioada iulie-august 2024. La această etapă au fost analizate și interpretate datele acumulate, fiind apreciat gradul de progres înregistrat în implementarea Programului. La nivel de impact, a fost efectuată analiza gradului de realizare a **indicatorilor de impact pentru fiecare obiectiv general**, fiind apreciați cu una din cele șase variante posibile *Devansare / Conform Planului / Întârziere / Fără progres / Regres / Nu poate fi evaluat* corespunzător cu descifrarea din tabel.

La nivel de rezultate, a fost analizat gradul de realizare a **indicatorilor de rezultat pentru fiecare obiectiv specific**, fiind apreciați cu una din cele șase variante posibile *Devansare / Conform Planului / Întârziere / Fără progres / Regres / Nu poate fi evaluat* corespunzător cu descifrarea din tabel.

Tabelul nr. 1 Descifrarea statutului gradului de realizare a indicatorilor de impact și de rezultat

Statutul gradului de realizare a indicatorului de impact / de rezultat	Descifrarea
<i>Devansare</i>	Valoarea constatată la finele anului 2023 este semnificativ mai apropiată de valoarea țintă (2025) decât valoarea de referință (2022).
<i>Conform planului</i>	Valoarea constatată la finele anului 2023 este egală (sau aproximativ egală) cu media dintre valoarea de referință (2022) și valoarea țintă (2025).
<i>Întârziere</i>	Valoarea constatată la finele anului 2023 este semnificativ mai apropiată de valoarea de referință (2022) decât de valoarea de țintă (2025).
<i>Fără progres</i>	Valoarea constatată la finele anului 2023 este aceeași cu valoarea de referință (2022).
<i>Regres</i>	Valoarea constatată la finele anului 2023 este opusă dinamicii planificate conform programului.
<i>Nu poate fi evaluat</i>	Datele privind valoarea indicatorului de impact nu sunt disponibile

La nivel de implementare, a fost analizat gradul de realizare a **indicatorilor de monitorizare** planificați pentru fiecare acțiune. Gradul de realizare a produselor a fost apreciat cu una din cele cinci variante posibile: *Realizat / Nerealizat (progres*

avansat) / Nerealizat (fără progres) / În proces / Neinițiat, corespunzător cu descifrarea din tabel.

Tabelul nr. 2 Descifrarea statutului gradului de realizare a indicatorilor de monitorizare

Statutul gradului de realizare a indicatorului de monitorizare	Descifrarea
<i>Realizat</i>	Produsul planificat a fost finalizat în termenul planificat.
<i>Nerealizat (progres avansat)</i>	Produsul planificat nu a fost finalizat, termenul a fost depășit, dar au fost realizate acțiuni semnificative pentru realizare.
<i>Nerealizat (fără progres)</i>	Produsul planificat nu a fost finalizat, termenul a fost depășit și nu au fost realizate acțiuni pentru realizare.
<i>În proces</i>	A început realizarea produsului planificat, iar termenul nu a fost depășit.
<i>Neinițiat</i>	Nu a început realizarea produsului, iar termenul de realizare nu a fost depășit.

La nivel de costuri, a fost analizat **gradul de finanțare și sursa de finanțare** a fiecărei acțiuni incluse în Planul de acțiuni. Gradul de finanțare a acțiunii a fost apreciat cu una din cele trei variante posibile: *Finanțat / Subfinanțat / Ne finanțat*, corespunzător cu descifrarea din tabel.

Tabelul nr. 3 Descifrarea statutului gradului de finanțare a acțiunilor

Statutul gradului de finanțare a acțiunii	Descifrarea
<i>Finanțat</i>	Au fost alocate resurse financiare necesare pentru realizare.
<i>Subfinanțat</i>	Au fost alocate parțial resurse financiare necesare pentru realizare.
<i>Ne finanțat</i>	Nu au fost alocate resurse financiare necesare pentru realizare.

III. Formularea constatărilor și recomandărilor

Această etapă a fost realizată în luna septembrie 2024, în baza unei structuri tip de raport comună pentru toate programele evaluate, care include grafice și tabele de sinteză a datelor prezentate și în raportul curent.

Constrângeri în procesul de evaluare

1. Timpul relativ scurt oferit pentru evaluarea intermediară a Programului – activitățile de colectare și analiză a informației a început în luna iulie curent. Însă, din cauză volumului de activități și sarcini de serviciu, timpul acordat pentru evaluarea intermediară a fost restrâns. Totodată, timpul alocat pentru realizarea unor obiective este mai restrâns decât ar fi necesar pentru realizarea calitativă a acestora.

2. Lipsa indicatorilor clari și a formulelor de calculare a indicatorilor în anul 2022 – unii indicatori privind valoare de referire în 2022 nu sunt clari, inclusiv nu se cunoaște formula după care s-au calculat acești indicatori. Or, în cadrul evaluării intermediare este necesar de utilizat aceeași formulă, pentru a stabili starea reală a lucrurilor.

3. Lipsa informațiilor privind resursele financiare pentru implementarea Programului.

3. Constatări

3.1 Constatări privind impactul Programului

Pentru consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență și excepționale, la etapa de elaborare a programului s-a stabilit necesitatea îmbunătățirii cadrului normativ de reglementare a activității în domeniile prevenirii, pregătirii și răspunsului în situații de urgență și excepționale, care va înlătura lacunele de ordin normativ, astfel eficientizând gestionarea situațiilor de urgență și excepționale.

În context, la realizarea indicatorului de impact „*Îmbunătățirea cadrului normativ*” la **Obiectivul general 1** „*Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență și excepționale*”, s-a constatat rezultatul de **conform planului**, întrucât, pe parcursul anilor 2022-2023, s-a reușit elaborarea și aprobarea a 4 acte normative, care este o precondiție pentru impactul scontat.

Pentru **Obiectivul general 2** „*Eficientizarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale*”, în anul 2023 s-a înregistrat rezultatul **conform planului** a indicatorului de impact „*Creșterea gradului de conștientizare al populației cu 3%*”.

Deși, pe parcursul anului 2023, nu s-au alocat mijloace financiare din bugetul de stat pentru elaborarea Studiului de fezabilitate a sistemului național de avertizare timpurie, IGSU a accesat la 2 proiecte privind elaborarea Studiului de fezabilitate a sistemului național de avertizare timpurie, realizarea căruia, conform proiectelor menționate, va continua și în perioada anilor 2024-2025.

Creșterea gradului de conștientizare al populației s-a datorat faptului desfășurării a 11 campanii de informare, fiind informate și instruite 698 945 persoane, realizării a 5 spoturi video cu caracter informativ și preventiv, iar pe rețele de socializare au fost distribuite 35 materiale informative și de prevenție. În comparație, pe parcursul anului 2022 au desfășurate 16 companii de informare, fiind instruite 963 572 persoane .

Pentru **Obiectivul general 3** „*Modernizarea sistemului național de pregătire pentru situații de urgență și excepționale*”, în anul 2023 s-a înregistrat un rezultat **conform planului** a indicatorului de impact planificat, care prevede *creșterea gradului de pregătire a serviciilor de urgență și a populației cu 10/2 %*. Astfel, acțiunile desfășurate au permis o creștere de 4,3% a gradului de pregătire a serviciilor de urgență și 0,3% a gradului de pregătire a populației, reprezentanților autorităților administrației publice, a sectorului privat, asociativ și voluntar în vederea gestionării eficiente a situațiilor de urgență și excepționale.

Valoarea indicatorului de impact al **Obiectivului general 4** „*Sporirea capacității operaționale și de răspuns în situații de urgență și excepționale*”, a înregistrat o **întârziere** în anul 2023. Indicatorul de impact urmărește reducerea timpului de reacție la 15 minute pentru 4% anual, din numărul total de intervenții. Misiunile de intervenție efectuate demonstrează o reducere a timpului de intervenție pentru 60% din misiuni, și anume:

- în anul 2022 din cele 22 179 misiuni de urgență, 59% au avut un timp de reacție de până la 15 minute;
- în anul 2023 din cele 14 727 misiuni de urgență, 61% au avut un timp de reacție de până la 15 minute.

Tabelul nr. 4.

Obiectivul general	Indicator de impact	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2023	Progres
Obiectivul general 1 Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență și excepționale	Îmbunătățirea cadrului normativ	-	16	4 (25%)	Conform planului
Obiectivul general 2 Eficientizarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale	Creșterea gradului de conștientizare al populației cu 3%	64% (2021)	67%	65,7% (creștere cu 1,7%)	Conform planului
Obiectivul general 3 Modernizarea sistemului național de pregătire pentru situații de urgență și excepționale	Creșterea gradului de pregătire a serviciilor de urgență și a populației cu 10/2 %	45/2	55/4	48,7% / 2.2% (anul 2023 - 3,7 / 0,2%)	Conform planului
Obiectivul general 4 Sporirea capacității operaționale și de răspuns în situații de urgență și excepționale	Timp redus la 15 minute pentru 4% anual, din numărul total de intervenții	24% (2021)	40%	25,2% (creștere cu 1,2%)	Întârziere

Concluzie: valoarea înregistrată de 2% pentru perioada anilor 2022-2023, prezintă întârziere care se datorează lipsei alocării de mijloace financiare din bugetul de stat, sistarea totală a activității echipajelor SMURD din cadrul intervențiilor comune, lipsa funcțiilor de paramedic pentru operaționalizarea echipajelor de prim ajutor calificat SMURD din cadrul IGSU (stoparea modificării HG 137/2019).

Gradul de realizare a indicatorilor de evaluare a impactului este redat în Tabelul nr. 4.

3.2 Constatări privind rezultatele programului

Per ansamblu în anii 2022-2023 Programul a produs rezultatele planificate. Doar 69,2% din rezultate au fost realizate conform planului sau au depășit indicatorii planificați. Cel mai mare nivel de realizare a obiectivelor specifice a fost înregistrat la Obiectivele generale 1, 3 și 4, rezultatele pentru toți indicatorii au fost conform planului. Au fost înregistrate devansări ale indicatorilor de rezultat și pentru obiectivele specifice ale Obiectivului general 3. Unele obiective specifice prevăzute pentru Obiectivul general 2 fie nu au înregistrat progres, fie au avut un progres minim. Un nivel redus de realizare a obiectivelor specifice a fost înregistrat la Obiectivul general 4 unde a fost înregistrat chiar un regres.

Analiza ritmului de avansare a indicatorilor de rezultat privind cele 13 de obiective specifice constată că, în anul 2023 s-a înregistrat o devansare a valorilor înregistrate în vederea implementării a 1 obiectiv specific (7,7%), întârzieri de realizare a indicatorilor privind 2 obiective specifice (15,4%), iar fără progres au fost evaluate 2 obiective specifice (15,4%).


Pentru obiectivul specific prevăzut la **Obiectivul general 1** nu au fost înregistrați indicatori cu întârziere sau cu regres, a fost realizat 1 indicator conform planului (100%);

Pentru obiectivele specifice prevăzute la Obiectivul general 2 au fost înregistrați - 1 indicator realizat conform planului, 1 indicator cu întârziere și 2 indicatori fără progres (25%);

La obiectivele specifice prevăzute la Obiectivul general 3 nu au fost înregistrați indicatori cu întârziere sau cu regres, au fost realizați 3 indicatori conform planului și 1 indicator cu devansare (100%).

Pentru obiectivele specifice prevăzute la Obiectivul general 4, 1 indicator este cu întârziere și 3 indicatori au fost realizați conform planului (75%) (*Graficul nr. 1*).

Graficul nr. 1

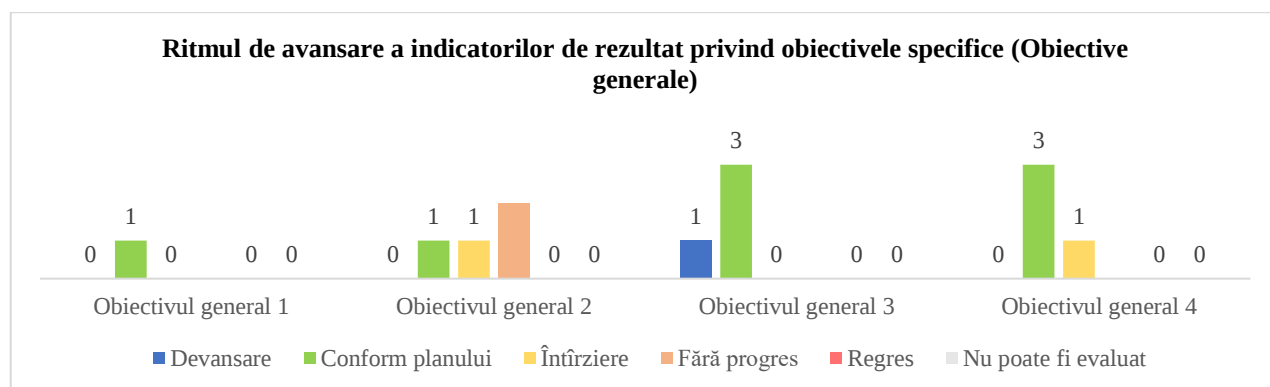

Astfel, situația la acest capitol, potrivit fiecărui obiectiv specific separat, este următoarea:

Obiectivul specific 1.1 „Perfecționarea legislației în domeniul situațiilor de urgență și excepționale” a înregistrat rezultatul **conform planului**, fiind atins, la finele anului 2023, rezultatul de 4 acte normative elaborate (25%) din cele 16 planificate spre realizare până la finele anului 2025 (*elaborate 4 acte normative noi, precum și efectuarea unor modificări la minim 12 acte normative*), ce reprezintă media dintre valoarea de referință (2022) și valoarea țintă (2025).

Astfel, pe parcursul anului 2023, au fost aprobate mai multe acte normative și au fost inițiate proiecte în proces de elaborare, care reglementează domeniul prevăzut de Program, și anume: adoptat 1 lege, 2 hotărâri de Guvern, 1 act normativ intern.

De asemenea, în anul 2023 a fost inițiat procesul de elaborarea a modificărilor la 5 acte normative (de modificare a actelor normative), precum și inițiată elaborarea a 2 proiecte de acte normative (*având termen de realizare trimestrul IV 2025*).

Cu risc de nerealizare: Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Proiectul de modificare a actului nominalizat a fost sistat, până la 31.12.2024, în temeiul Dispoziției Guvernului RM nr.2-d din 11.01.2024.

Tabelul nr. 5 Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat privind Obiectivele specifice subsecvente Obiectivului general 1

Obiectivul specific	Indicator de rezultat al politicii publice	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2023	Progres
Obiectivul specific 1.1 Perfecționarea legislației în domeniul situațiilor de urgență și excepționale	Cel puțin 4 acte normative noi elaborate și cel puțin 12 intervenții normative în cadrul normativ actual	-	16	4	Conform planului

Obiectivul general 2 și-a propus spre realizare 4 obiective specifice.

Obiectivul specific 2.1. „Operaționalizarea până în anul 2025 a sistemului național de avertizare timpurie”. Obiectivul vizat urmărește crearea unui Sistem de avertizare național de avertizare timpurie, însă, la finele anului 2023, acesta rămâne **fără progres**.

Totodată, IGSU al MAI a accesat la 2 proiecte privind elaborarea studiului de fezabilitate a sistemului național de avertizare timpurie, după cum urmează:

1. Proiectul „Îmbunătățirea sistemului de reacționare la situații de urgență a Republicii Moldova prin implementarea unui sistem de avertizare timpurie”, realizat de către Uniunea Internațională pentru telecomunicații, în cadrul căruia, pe parcursul a șase luni ale anului 2023 a fost elaborat un studiu de pre-fezabilitate în care au fost examinate riscurile, nivelul de dezvoltare tehnologică a țării noastre, furnizorii de comunicații electronice, dar și s-a luat în vizor practica internațională în domeniu. Evenimentul de închidere a proiectului a avut loc la 26 ianuarie 2024 în incinta IGSU al MAI.

2. Proiectul UE UCPM-2023-TRACK1-IBA Technical Assistance for Disaster Risk Management (Track 1). Bugetul proiectului - 442 523 euro dintre care 8% cota RM. Durata proiectului 12 luni. Lansarea proiectului a avut loc la 28 februarie 2024.

Urmare a elaborării studiului de fezabilitate menționat, IGSU al MAI va elabora conceptul sistemului național de avertizare timpurie și a Regulamentului de utilizare a sistemului național de avertizare timpurie, care vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern. (*Acțiune transferată pentru anul 2024*).

Obiectivul specific 2.2 „Consolidarea activității de comunicare și informare preventivă”. Obiectivul vizat urmărește crearea a 3 module de prevenire operaționale. În anul 2023 nu a fost înregistrat progres la realizarea acțiunii (**fără progres**). Termenul de realizare a acțiunii este planificat pentru finalizare în trimestrul IV 2025.

Obiectivul specific 2.3 „Sporirea până în anul 2025 a gradului de integrare și implicare a voluntariatului în viața comunității”, cu indicator de rezultat - 7 posturi de salvatori și pompieri voluntari instituite; 500 de voluntari instruiți.

În trimestrul IV al anului 2022 au fost instituite 2 posturi teritoriale de salvatori și pompieri (s. Sărăteni, r-nul Hîncești și s. Dezghingea, UTA Găgăuzia) cu un total

de 67 voluntari identificați. De asemenea, pe parcursul anului 2022 un fost instruiți 160 pompieri voluntari.

Pe parcursul anului 2023 au fost instituite 2 posturi teritoriale de salvatori și pompieri (s. Etulia, UTA Găgăuzia (2 angajați civili) și s. Căpriana, r-nul. Strășeni (11 voluntari), și au fost donate de către Asociația pompierilor voluntari din Republica Austria 3 autospeciale pentru operaționalizarea viitoarelor posturi de salvatori și pompieri din localitățile Trebujeni, r-nul Orhei, Suhuluceni, r-nul Telenești și Cîrnățenii Noi, r-nul Căușeni.

Totodată, au fost instruiți 72 de salvatori și pompieri din cadrul posturilor.

Obiectivul specific 2.4 „Creșterea calității procesului instituțional de expertiză în prevenirea situațiilor de urgență”, indicatorul de rezultat fiind, cel puțin 2 genuri de expertiză acreditate, care **nu poate fi evaluat** (neinițiat).

De menționat, că termenul de realizare a acțiunii este planificat pentru finalizare în trimestrul IV 2025. În vederea asigurării continuității în procesul de dezvoltare a capacităților profesionale 2 angajați ai IGSU au participat la cursul de instruire „Operațiuni în caz de accidente chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) – exploatare și mentenanță echipament”, organizat de către Agenți de Apărare și Reducere a Amenințărilor (DTRA) a Departamentului de Apărare al SUA (Tabelul nr. 6).

Tabelul nr. 6 Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat privind Obiectivele specifice subsecvente Obiectivului general 2

Obiectivul specific	Indicator de rezultat al politicii publice	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2023	Progres
Obiectivul specific 2.1 Operaționalizarea până în anul 2025 a sistemului național de avertizare timpurie	Sistem de avertizare creat	-	2	0	Fără progres Acțiune transferată pentru anul 2024.
Obiectivul specific 2.2 Consolidarea activității de comunicare și informare preventivă	3 module de prevenire operaționale	0	3	0	Fără progres
Obiectivul specific 2.3 Sporirea până în anul 2025 a gradului de integrare și implicare a voluntariatului în viața comunității	7 posturi de salvatori și pompieri voluntari instituite; 500 de voluntari instruiți	17/336	24/836	21/568	Conform planului
Obiectivul specific 2.4 Creșterea calității procesului instituțional de expertiză în prevenirea situațiilor de urgență	Cel puțin 2 genuri de expertiză acreditate	0	2	0	Nu poate fi evaluat (neinițiat)

Obiectivul general 3 și-a propus spre realizare 4 obiective specifice:

Obiectivul specific 3.1 „Dezvoltarea capacităților naționale de pregătire și instruire în situații de urgență și excepționale”, cu indicator de rezultat - creșterea

graduală a capacităților de pregătire cu 30 p.p. Progresul înregistrat - **conform planului**.

În perioada trimestrului IV 2022-2023 au fost finalizate lucrările de renovare și inaugurat noul sediu al CRI din s. Răzeni, r-nul Ialoveni (fiind renovate 2 sedii). Au fost create și operaționalizate 4 module de instruire și achiziționate 3 seturi de echipamente pentru activitățile de instruire. S-au elaborat 3 curricule noi de instruire și au fost instruiți 771 angajați ai IGSU.

De asemenea, numărul de formatori în cadrul Inspectoratului a crescut de la 10 angajați în anul 2021 la 35 angajați/formatori la finele anului 2023.

Instruirea diferitor categorii de populație în domeniul protecției civile, apărării împotriva incendiilor și acordării primului ajutor, a cuprins un total de 7 107 persoane în perioada anilor 2022-2023. Pe parcursul anului 2023 au fost desfășurate instruirii în domeniul acordării primului ajutor calificat pentru:

- 769 persoane din rândul populației ;
- 13 angajați IGSU (86%).

Dezvoltarea acestor capacități în perioada anilor 2022-2023, ne atestă o creștere cu aproximativ 44% a numărului de persoane instruite.

Obiectivul specific 3.2 „Valorificarea oportunităților de participare la instruire/exerciții pe plan internațional”, drept indicator de rezultat fiind stabilit - cel puțin 80% din numărul ofertelor corespunzătoare necesităților de participare valorificate. Progresul înregistrat - **conform planului**.

Astfel, pe parcursul anului 2023, 6 angajați ai IGSU al MAI au participat la 3 cursuri de instruire, și anume:

- 1) Curs de introducere în Mecanismul de protecție civilă al UE - 1 angajat;
- 2) Curs de instruire la nivel înalt în cadrul programului PPRD East-3, or. Bruxelles, Belgia - 4 angajați;
- 3) Curs de introducere în EUCPM pentru punctele naționale de contact, or. Bruxelles, Belgia - 1 angajat.

În anul 2023, 112 angajați au participat în cadrul a 6 exerciții de tip TTX și FSX desfășurate în Georgia, Norvegia, Republica Polonă, România. Cheltuielile suportate de către partenerii de dezvoltare nu pot fi identificate.

Pe parcursul anului 2023, 6 angajați ai IGSU al MAI au participat la 3 cursuri de instruire.

Au fost organizate și desfășurate 5 exerciții, și anume:

- 1) Exercițiul de Stat Major în cadrul Proiectului „Exerciții de masă pentru susținerea națiunii gazde a UE” EU-HNS TTX cu participarea experților din 13 țări, total 94 participanți;
- 2) Exercițiul cu forțe în teren „Prut 2023”, au participat total 21 angajați IGSU al MAI;
- 3) Exercițiul de teren la scară largă ”EURO-MED-REACT 2023” cu participarea a 147 de salvatori și pompieri din România, Letonia, Slovacia, Cehia, Ucraina, Polonia și angajații IGSU al MAI;
- 4) Exercițiul de Stat major pentru testarea Planului comun de intervenție, în cadrul proiectului ”Răspuns comun eficient la situații de urgență transfrontaliere” cu participarea a 12 angajați IGSU;

5) Exercițiu cu forțe și mijloace în teren ”Ecou 2023” desfășurat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacităților de comunicații bazate pe TIC în zona transfrontalieră RO-RM”, cu participarea a 58 angajați IGSU al MAI.

De asemenea, pe parcursul anului 2023, 37 angajați ai IGSU al MAI au participat la 11 vizite de lucru, vizite de studiu și schimb de experiență în Japonia, Polonia, Regatul Țărilor de Jos, Franța, Lituania, România, Azerbaidjan.

Obiectivul specific 3.3 „Fortificarea capacităților grupurilor-țintă (populației, autorităților administrației publice, sectorului privat, asociativ și voluntar) în gestionarea situațiilor de urgență și excepționale”. Indicator de rezultat - cel puțin 10 aplicații tactice comune desfășurate anual. Progresul înregistrat - **conform planului**.

Pe parcursul anului 2023 au fost desfășurate:

- 7 aplicații cu antrenarea APL și APC în mun. Bălți și raioanele Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Florești, Strășeni și Nisporeni cu antrenarea a 1135 persoane;

- 1 Exercițiu de Stat Major(TTX) ”Consolidarea capacităților de prevenire, pregătire și răspuns a administrației publice centrale și entităților publice responsabile de gestionarea situațiilor de urgență și excepționale”, au participat 58 persoane din 14 autorități publice centrale și 2 organizații internaționale (UNHCR și OIM).

De asemenea, în anul 2023 au fost desfășurate 10 exerciții tactice, cu antrenarea a 418 persoane/angajați din 10 instituții și întreprinderi.

Obiectivul specific 3.4 „Eficientizarea până în anul 2025 a activității de administrare și consolidare a capacității rezervelor de stat și de mobilizare”, cu indicator de rezultat - creșterea anuală cu cel puțin 8 p.p. a nivelului de completare a rezervelor de stat și de mobilizare începând cu anul 2023. Progresul înregistrat - **devansare**.

Conform planului de acumulare pentru anul 2023, au fost efectuate:

- procurări de bunuri în sumă de 416688,9 mii lei. Nivelul de completare a rezervelor de stat constituia circa 65,1%.

- procurări de bunuri în rezervele de mobilizare, în sumă de 2436,1 mii lei. Nivelul de completare a bunurilor materiale din rezervele de mobilizare, constituia circa 77 %. A fost desfășurate 64 de proceduri de achiziții publice (Tabelul nr. 7).

Tabelul nr. 7 Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat privind Obiectivele specifice subsecvente Obiectivului general 3

Obiectivul specific	Indicator de rezultat al politicii publice	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2023	Progres
Obiectivul specific 3.1 Dezvoltarea capacităților naționale de pregătire și instruire în situații de urgență și excepționale	Creșterea graduală a capacităților de pregătire cu 30 p.p.	50%	80%	70% (creștere cu 23.1 p.p.)	Conform planului
Obiectivul specific 3.2 Valorificarea oportunităților de participare la instruire/exerciții pe plan internațional	Cel puțin 80% din numărul ofertelor corespunzătoare necesităților de participare valorificate	60	80	97%	Conform planului
Obiectivul specific 3.3 Fortificarea capacităților grupurilor-țintă (populației, autorităților	Cel puțin 10 aplicații tactice comune desfășurate anual	-	30	18	Conform planului

<i>administrației publice, sectorului privat, asociativ și voluntar) în gestionarea situațiilor de urgență și excepționale</i>					
Obiectivul specific 3.4 Eficientizarea până în anul 2025 a activității de administrare și consolidare a capacității rezervelor de stat și de mobilizare	Creșterea anuală cu cel puțin 8 p.p. a nivelului de completare a rezervelor de stat și de mobilizare începând cu anul 2023	41%	65%	30 p.p.	Devansare

Obiectivul general 4 și-a propus spre realizare 4 obiective specifice:

Obiectivul specific 4.1 „Creșterea până în anul 2025 a condițiilor de muncă de calitate înaltă pentru a stimula creșterea eficienței angajaților din domeniul situațiilor de urgență și excepționale”, cu indicator de rezultat - 12 sedii asigurate cu condiții corespunzătoare de muncă. Progresul înregistrat - **conform planului**.

Pe parcursul anului 2023 au fost renovate / construite 2 puncte de operare terestră SMURD în orașele Ungheni și Cantemir.

În scopul construcției PSP Holercani pe parcursul anului 2023 a fost elaborat proiectul tehnic (200 mii lei).

Pe parcursul anului 2022 au fost finalizate lucrările de construcție a 2 sedii a remizelor de pompieri și salvatori din or. Ștefan Vodă și or. Ungheni.

Unitatea de salvatori și pompieri din or. Ungheni, operaționalizată în anul 2022. Această investiție a fost completată cu un proiect suplimentar finanțat din fondurile UE. Construit cu suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii.

Unitatea de salvatorii și pompierii din or. Ștefan Vodă a fost operaționalizată în decembrie 2022, de asemenea fiind construită cu suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii.

În anul 2023 a fost construit și operaționalizat Dispeceratul Integrat pentru situații de urgență NORD. Prin această investiție a fost substanțial îmbunătățit procesul de gestionare a situațiilor de urgență pentru toată zona nordică a țării, având în vedere faptul, că acest Dispecerat deservește apelurile de urgență din mun. Bălți și 11 raioane din nord.

Pe parcursul anului 2023, au continuat lucrările de construcție a USP Șoldănești, se planifică darea în exploatare în anul 2024. Totodată, au fost demarate lucrările de construcție a USP Ocnita, Dondușeni și Căinari, se planifică finalizarea lucrărilor la finele anului 2024.

Obiectivul specific 4.2 „Asigurarea până în anul 2025 a condițiilor conforme normelor pentru toate tipurile de intervenții”, având drept indicator de rezultat - creșterea cu 10 p.p. a mijloacelor tehnice de intervenție care corespund normelor de dotare. Progresul înregistrat - **conform planului**.

La 20.01.2023, în or. Tokyo conducerea IGSU a semnat contractul între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI din Republica Moldova și compania „Toyota Tsusho Corporation” din Japonia. privind fabricarea și livrarea a 19 autospeciale pentru salvatori și pompieri. Tehnica produsă în Japonia va fi bazată

pe șasiu european și urmează a fi livrată în Republica Moldova într-un termen de 23 de luni.

În anul 2022 au fost achiziționate și repartizate efectivului de pompieri din cadrul subdiviziunilor IGSU:

- 66 seturi Aparare izolante cu aer comprimat pentru respirație;
- 182 buc căști de protecție pentru pompieri;
- 400 seturi costume de protecție pentru pompieri;
- 400 buc. cagule pentru pompieri;
- 400 buc centuri de siguranță pentru pompieri.

În total, pe parcursul anului 2023 au fost achiziționate:

- 450 costume de protecție pentru pompieri (creștere cu 44%);
- 250 căști de protecție pentru pompieri (creștere cu 53%);
- 450 centuri de siguranță pentru pompieri (creștere cu 44%);
- 250 cagule pentru pompieri (creștere cu 25%).

Setate 250 seturi.

În anul 2023 au fost valorificați 2 000 000 lei alocați pentru dezvoltarea sub-modulului logistic al echipei USAR Moldova în contextul furnizării serviciilor de asistență internațională în materie de protecție civilă.

Obiectivul specific 4.3 „Dezvoltarea capacității de furnizare a asistenței internaționale în materie de protecție civilă”, cu indicator de rezultat - 2 module operaționalizate, progresul înregistrat este - **conform planului**.

La modulul USAR (Urban Search and Rescue) în anul 2023 au fost realizate::

- aprobat/actualizat cadrul normativ al modulelor;
- instruiți 11 angajați cu funcții de conducere din cadrul echipei USAR, în perioada 24-28 iulie 2023, cu suportul Fundației „Solidarity Fund PL” și Institutul „iHELP” din Republica Polonă. Cursul de instruire privind utilizarea Sistemului de coordonare și management INSARAG „ICSM management tools” și a platformei Virtual OSOCC;

- instruiți 10 angajați cu funcții de conducere din cadrul echipei USAR, în perioada 10-13 octombrie 2023, cu suportul Fundației „Solidarity Fund PL” și Institutul „iHELP” din Republica Polonă. Cursul de instruire privind utilizarea Sistemului de coordonare și management INSARAG, funcționalitatea RDC și UCC.

S-a desfășurat exercițiul de testare a procesului de clasificare externă echipei de căutare - salvare urbană USAR Moldova, în perioada 22-24 noiembrie 2023.

Capacitățile de funcționare a modulului au fost testate în timpul misiunii de acordare a sprijinului autorităților turcești la efectuarea operațiunilor de căutare-salvare urbană în urma cutremurului de pământ, în perioada 06-17 februarie 2023.

Participarea efectivului Modulului de intervenție GFFF-V MD în perioada 10-21 iunie 2023 la Exercițiul de teren la scară largă – TbiEx 2023, în orașul Tbilisi, Georgia.

Obiectivul specific 4.4 „Sporirea până în anul 2025 a rezilienței la situații care pun în pericol sănătatea oamenilor”, cu indicatorul de rezultat - dezvoltarea misiunilor de intervenție atribuite SMURD, în perioada evaluată s-a înregistrat **regres**.

Astfel, în comparație cu anul 2022, când au fost desfășurate 21 intervenții SMURD, pe parcursul anului 2023 au fost desfășurate doar 16 intervenții, dintre care:

- misiuni primare - 1;
- misiuni secundare - 14;
- misiuni transfrontaliere - 4, și anume:
- din Bulgaria în Republica Moldova, la data de 11.01.2023;
- din Polonia în Republica Moldova, ca urmare a solicitării parvenite la data de 02.02.2023;
- din România în Republica Moldova, la data de 24.02.2023;
- din România în Republica Moldova, la data de 30.08.2023.

Motivarea privind riscul neîndeplinirii acțiunii:

a) Odată cu implementarea Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, serviciul SMURD al IGSU din motive nedefinite continuă a nu fi implicat în intervențiile comune, necotând că se regăsește în Indexul de cooperare și intervenție/indexul de caz dintre echipajele de intervenție de urgență ale Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne;

b) Sistarea totală din anul 2017 a activității echipajelor SMURD din cadrul intervențiilor comune, în deosebi a celor cu Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP);

c) Lipsa funcțiilor de paramedic pentru operaționalizarea echipajelor de prim ajutor calificat SMURD din cadrul IGSU al MAI (stoparea modificării HG 137/2019) (Tabelul nr. 8).

Tabelul nr. 8 Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat privind Obiectivele specifice subsecvente Obiectivului general 4

Obiectivul specific	Indicator de rezultat al politicii publice	Valoarea de referință (2022)	Ținta care urmează a fi atinsă (2025)	Valoarea înregistrată la finalul anului 2023	Progres
Obiectivul specific 4.1 Creșterea până în anul 2025 a condițiilor de muncă de calitate înaltă pentru a stimula creșterea eficienței angajaților din domeniul situațiilor de urgență și excepționale	12 sedii asigurate cu condiții corespunzătoare de muncă	76	88	80 (4 sedii în perioada 2022-2023)	Conform planului
Obiectivul specific 4.2 Asigurarea până în anul 2025 a condițiilor conforme normelor pentru toate tipurile de intervenții	Creșterea cu 10 p. p. a mijloacelor tehnice de intervenție care corespund normelor de dotare	53,5%	63,5%	54,6%	Conform planului
Obiectivul specific 4.3 Dezvoltarea capacității de furnizare a asistenței internaționale în materie de protecție civilă	2 module operaționalizate	-	2	1 modul (44%)	Conform planului
Obiectivul specific 4.4 Sporirea până în anul 2025 a rezilienței la situații care pun în pericol sănătatea oamenilor	Dezvoltarea misiunilor de intervenție atribuite SMURD	0	6000	36 (0,6%)	Întârziere

3.3 Constatări privind implementarea acțiunilor și realizarea livrabililor

Din considerentul că Programul a fost aprobat în decembrie 2022, rapoarte cu privire la implementarea Programului pentru anul 2022 nu au fost elaborate. Respectiv, raportul curent reflectă rezultatele înregistrate în anii 2022-2023.

Planul de acțiuni conține 9 de indicatori de monitorizare cu termen de realizare în perioada 2022-2023. În urma implementării acțiunilor planificate pentru anul 2023 au fost înregistrate progrese moderate în livrarea produselor. Din cei 9 de indicatori planificați pentru 2022-2023, 3 indicatori au statut de **realizat (33%)**, 6 indicatori sunt **nerealizați** în termen, însă au înregistrat **progres avansat (66%)**. (Tabelul 9).


Aproape jumătate din indicatorii de monitorizare planificați pentru perioada supusă evaluării se referă la acțiuni planificate pentru **Obiectul general 1** (4 indicatori), din care au fost **realizați 75%**. Pentru **Obiectivul general 2**, au fost planificați 3 indicatori de monitorizare, din care **0% realizați** în termen, iar **Obiectivul general 3** a avut planificați 2 indicatori de monitorizare, din care au fost **realizați 0%** în termen.

Cât privește gradul de realizare a indicatorilor de monitorizare pentru întreaga perioadă de implementare a Programului (2022-2025), în total au fost planificați 81 de indicatori de monitorizare. Dintre aceștia, până la finele anului 2023, 10 indicatori au fost **realizați (12%)**, 6 indicatori sunt **nerealizați**, însă au înregistrat **progres avansat (7%)**, 1 indicator este **Nerealizat (fără progres) (1%)**, 50 de indicatori sunt **în proces de realizare (61%)**, iar 14 – rămân **neinițiați (17%)** (Tabelul 9 și Graficul 2).

Tabelul nr. 9: Gradul de realizare a indicatorilor de monitorizare din Planul de acțiuni pentru implementarea Programului 2022-2025

Termenul	Nr. indicatorilor	Realizat	Nerealizat (progres avansat)	Nerealizat (fără progres)	În proces	Neinițiat	Rata de implementare
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	9	3	6	0	0	0	33%
2024	11	0	0	1	5	5	0%
2025	61	7	0	0	45	9	11%
Total	81	10	6	1	50	14	12%

Graficul nr. 2

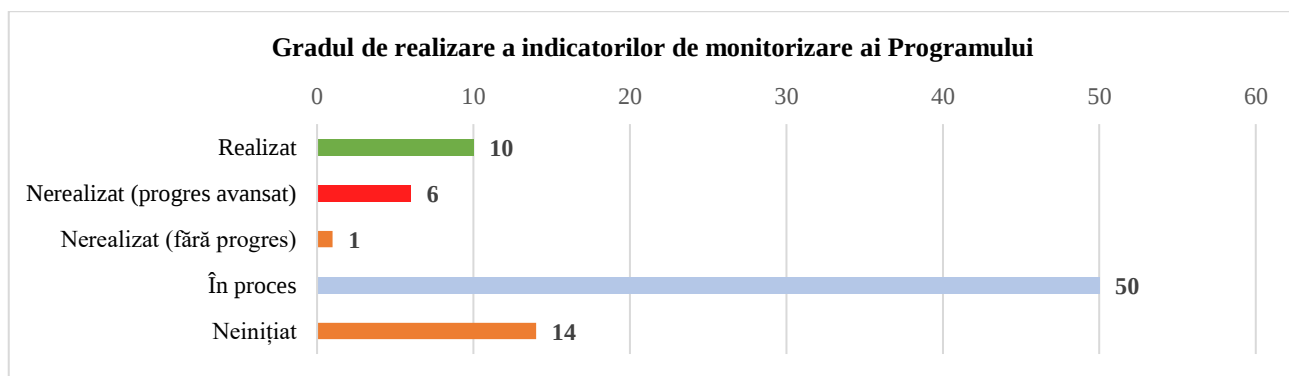

Urmare a unei analize privind realizarea produselor distribuite pe obiective se constată următoarele:


La **Obiectivul general 1** au fost realizate 3 produse (25%), 6 produse sunt în proces de realizare (50%), 2 produse neinițiate (17%) și 1 produs nerealizat (8%, progres avansat).

La **Obiectivul general 2** au fost realizate 3 produse (12%), 11 produse sunt în proces de realizare (44%), 8 produse neinițiate (32%) și 3 produse nerealizate (12%, progres avansat).


La **Obiectivul general 3** au fost realizate 4 produse (16%), 17 produse sunt în proces de realizare (68%), 2 produse neinițiate (8%) și 2 produse nerealizate (8%, progres avansat).

La **Obiectivul general 4** au fost realizate 0 produse (0%), 16 produse sunt în proces de realizare (84%), 2 produse neinițiate (11%) și 1 produs nerealizat (5%, fără progres).

Graficul nr. 3.

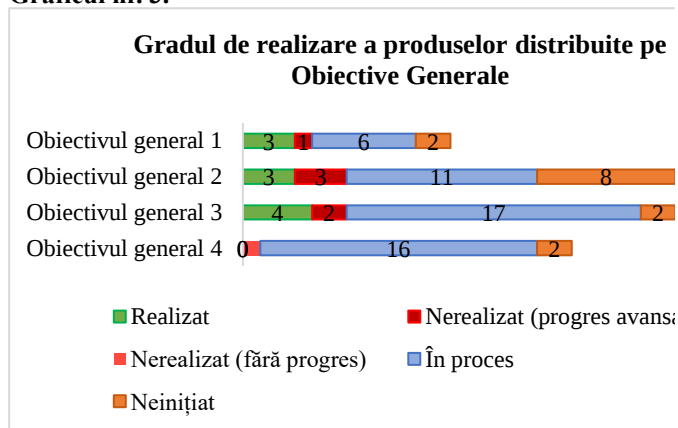


Graficul nr. 4.

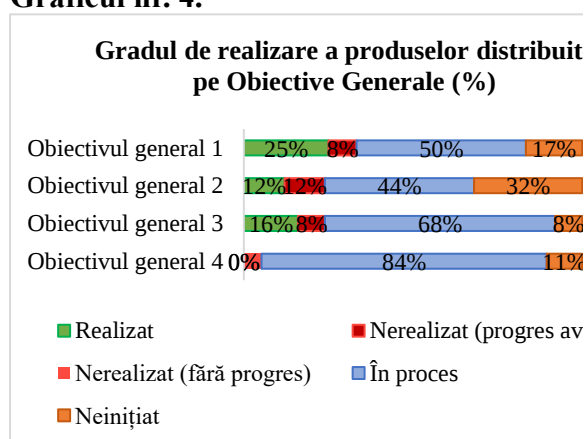


Analiza după tipul de produse realizate (*Graficele nr. 5 și nr. 6*), arată că în perioada 2022-2023, livrabilele programului au constatat preponderent în *modificări sau completări ale cadrului legislativ și normativ, precum și dotări și echipare* – 6 produse (în total 60%). Alte livrabile realizate au fost campanii și resurse informaționale – 2 produse (20%) și tot spectrul de evenimente, reuniuni, instruirii și dezvoltarea infrastructurii – 2 produse (20%).

Graficul nr. 5

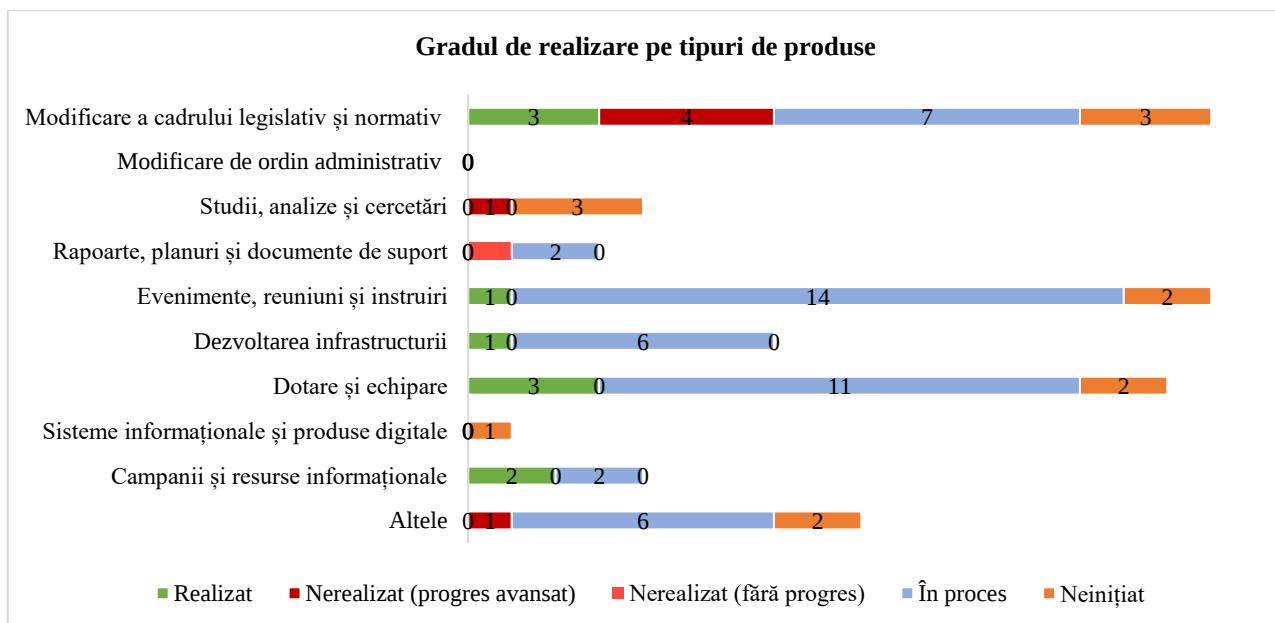

Graficul nr. 6

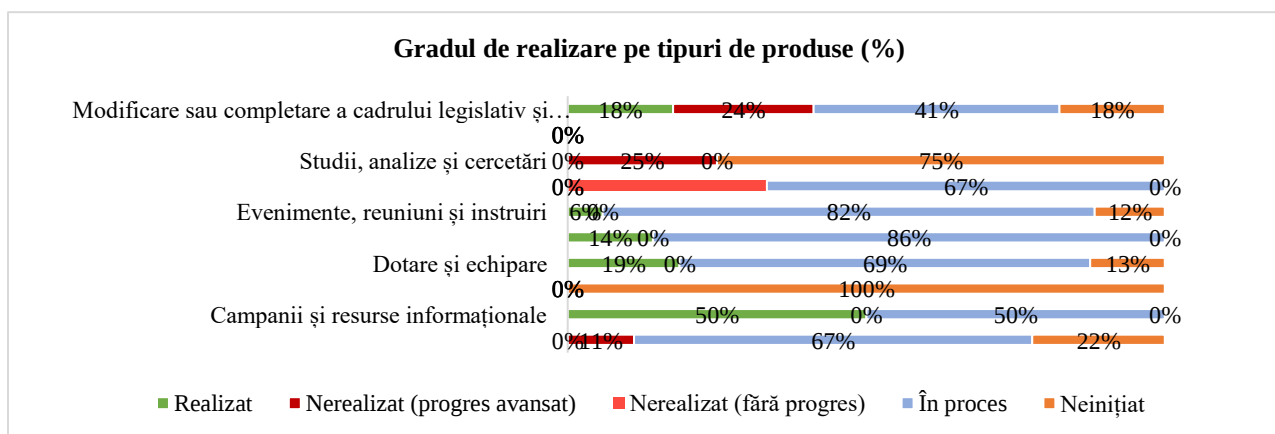

În concluzie, cu referire la gradul de realizare a **produselor pentru fiecare obiectiv general**, pentru întreaga perioadă (2022-2025) constatăm că, **Obiectivul general 1** are cel mai avansat grad de implementare al acțiunilor prin care au fost realizate 3 produse (25%), 6 produse sunt în proces de realizare (50%), 1 produs nerealizat (8%), iar 2 produse sunt neinițiate (17%). Următorul ca nivel de progres al livrării produselor este **Obiectivul general 3**, pentru care au fost **realizate** 4 produse (16%), 2 produse sunt **nerealizate**, însă a înregistrat un **progres avansat** (8%), 17 produse sunt **în proces** de realizare (68%), iar 2 produse sunt **neinițiate** (8%). **Obiectivul general 2** au fost **realizate** 3 produse (12%), 3 produse sunt **nerealizate**, însă a înregistrat un **progres avansat** (12%), 11 produse sunt **în proces** de realizare (44%), iar 8 produse sunt **neinițiate** (32%).

Cel mai mic progres s-a înregistrat în privința acțiunilor planificate pentru **Obiectivul general 4** a fost **realizat** 0 produse (0%), 1 produs este **nerealizat (fără**

progres) (5%), 16 produse sunt **în proces** de realizare (84%), iar 2 produse sunt **neinițiate** (11%).


3.3.1 Gradul de realizare a produselor privind Obiectivul general 1

Pentru consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență și excepționale, la etapa de elaborare a programului s-a stabilit necesitatea îmbunătățirii cadrului normativ de reglementare a activității în domeniile prevenirii, pregătirii și răspunsului în situații de urgență și excepționale, care va înlătura lacunele de ordin normativ, astfel eficientizând gestionării situațiilor de urgență și excepționale. Analiza efectuată a demonstrat o necesitate de a fi elaborate 4 acte normative noi, precum și efectuarea unor modificări la minim 12 acte normative.


Analizând progresul și gradul de realizare a produselor, s-a stabilit că, în perioada 2022-2023, în cadrul **Obiectivului general 1** au fost finalizate 3 livrabile - acțiunile 1.1.1, 1.1.7 și 1.1.8 (din 4 planificate pentru anul 2023) și 1 livrabil nerealizat (acțiunea 1.1.9). Proiectul elaborat a fost transmis către Guvern, la moment, nu este primită o decizie privind promovarea acestuia, acțiunea fiind transferată pentru anul 2024.

Din totalul de 12 produse planificate (**1 obiectiv specific planificat**), în perioada trimestrului IV anul 2022 - anul 2023 au fost realizate 3 produse (25%), 6 produse sunt în proces de realizare (50%), 2 produse neinițiate (17%) și 1 produs nerealizat (8%, progres avansat) (*Graficele nr. 7 și nr. 8 și Tabelul nr. 10*)

Graficul nr. 7

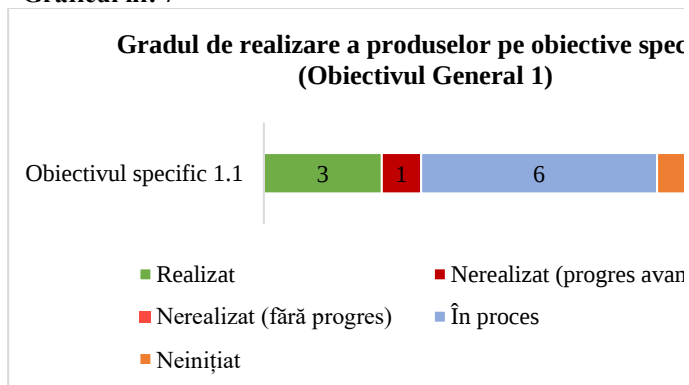

Graficul nr. 8

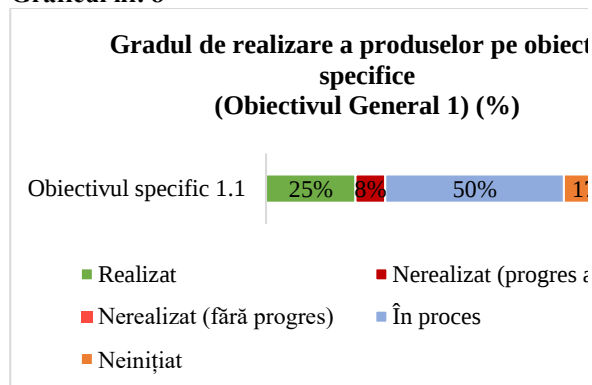

Tabelul nr. 10 Progresul și gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general 1

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
1.1. Perfecționarea legislației în domeniul situațiilor de urgență și excepționale	1.1.1. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii voluntariatului nr. 121/2010	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Educației și Cercetării <i>Parteneri:</i> Congresul Autorităților Locale din Moldova; Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Moldova; Solidarity Fund PL in Moldova	Realizat Proiectul a fost adoptat în ședința Parlamentului din 24.11.2023, Legea nr. 346/2023.
	1.1.2. Actualizarea integrală a Legii nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor și a Legii nr. 271/1994 cu privire la protecția civilă	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	MAI (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	În proces A fost efectuată analiza cadrului normativ în domeniul protecției civile. De către angajații IGSU urmează a fi realizată analiza de impact a proiectului.
	1.1.3. Modificarea cadrului normativ referitor la domeniul rețelei naționale de observare și control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	MAI (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Mediului;	În proces În proces de elaborare proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 961/2006 cu privire la aprobarea Regulamentului rețelei naționale de observare și control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător

	substanțe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice și agenți biologici					Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Agenția Națională pentru Sănătate Publică; Agenția Proprietății Publice	cu substanțe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice și agenți biologici.
	1.1.4. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea în domeniul protecției civile	Hotărâre Guvernului aprobată a	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	Neinițiat
	1.1.5. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului și a Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova	Hotărâre Guvernului aprobată a	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Finanțelor	În proces 1. Proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului (număr unic 1066/MAI/2023) a fost examinat în ședința secretarilor generali din 04.02.2023 și supus avizării externe. La moment proiectul este în proces de definitivare. 2. A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 19/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
	1.1.6. Elaborarea cadrului normativ pentru reglementarea participării la activități internaționale (misiuni/exerciții)	Hotărâre Guvernului aprobată a	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	MAI (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe, IGSU al MAI); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Finanțelor	În proces Este în proces de elaborare proiectul de lege de transpunere a Deciziei 1313/2013 privind Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.

1.1.7. Reglementarea procedurilor de transportare a cetățenilor aflați în dificultate în afara țării, inclusiv în dificultate cu caracter medical	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2023	MAI (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Sănătății	Realizat Hotărârea Guvernului nr. 675/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a misiunilor transfrontaliere cu ambulanțele Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD).
1.1.8. Elaborarea și modificarea cadrului normativ pentru reglementarea statutului de paramedic/ recunoașterea studiilor de paramedic	Cadru normativ elaborat și aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2023	MAI (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Sănătății	Realizat Ordinul șefului IGSU nr. 297 din 21.12.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipajelor de prim ajutor calificat a Serviciului mobil de urgență reanimare și descarcerare.
1.1.9. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență	Hotărâre a Guvernului aprobată; state de personal ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne suplinite (număr de persoane 123 ¹)	Anul 2023 – 16491,0; anul 2024 – 16491,0; anul 2025 – 16491,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	Nerealizat (progres avansat) La data de 10.07.2023, a fost remis un demers în adresa Prim-ministrului Republicii Moldova referitor la promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (nr. 44/30-3097 din 10.07.2023). Ulterior, în adresa Prim-ministrului Republicii Moldova a fost expediat un demers cu prezentarea argumentării justificate referitoare la capitolul majorării efectivului limita al IGSU al MAI cu 130 unități suplimentare, reieșind din avizul Cancelariei de Stat din 20 iulie 2023. În rezultatul ședinței pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova din 13.10.2023 s-a decis de a remite un demers repetat cu referire la argumentarea privind majorarea efectivului limita al IGSU al MAI.

¹ Pentru perioada 2022-2025 sunt planificate pentru suplinire 123 de funcții strict necesare. În etapa a doua de implementare a Programului (2025-2030) este planificată suplinirea cu 177 de funcții necesare pentru redimensionarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne.

							La 03.11.2023, a fost remisă către Prim-ministru Nota informativă privind clarificările solicitate (nr. ieșire al MAI 44/30-4981). Acțiune transferată pentru anul 2024
	1.1.10. Stabilirea competențelor autorităților publice centrale privind gestionarea situațiilor de urgență și excepționale	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	MAI (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe, IGSU al MAI); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătății	În proces Pe parcursul anului 2023 a fost inițiat procesul de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind stabilirea competențelor autorităților publice centrale privind gestionarea situațiilor de urgență și excepționale.
	1.1.11. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1076/2010 cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces 1. Pentru a putea evalua criteriile care vor fi incluse în tabelul modificat „Criteriile de evaluare a situațiilor excepționale” al Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1076/2010, la data de 25.05.2023 a fost înaintat un demers cu nr. 19/6-1069, prin care IGSU a solicitat prezentarea indicatorilor care permit identificarea împrejurărilor de secetă cu pragurile concrete. 2. La 21.11.2023, IGSU a desfășurat o ședință de lucru interministerială cu participarea reprezentanților entităților interesate (Ministerul Mediului (MM), Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS)), în urma căreia au fost luate următoarele decizii, consemnate în Procesul-verbal nr.19/6-2712 din 29.11.2023: a) organizarea și desfășurarea unei ședințe de consultare a mediului academic, autorităților publice locale și a agenților economici privind modificările propuse la HG nr. 1076/2010; b) înaintarea de către a SHS și MAIA a propunerilor de modificare a HG 1076/2010.

							3. La 14.12.2023, IGSU a solicitat din partea SHS (scrisoarea nr.19/6-2832 din 14.12.2023) informația despre progresul înregistrat vizavi de propunerile la proiectul hotărârii privind modificarea Regulamentului cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1076/2010, astfel încât acestea să fie prezentate pentru consultări și avizare reprezentanților mediului academic și ai altor entități cu responsabilități în domeniu.
	1.1.12. Modificarea actelor normative privind atribuirea IGSU al MAI a competențelor de constatare a incendiilor	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Justiției	Neinițiat

3.3.2 Gradul de realizare a produselor privind Obiectivul general 2

În rezultatul analizei realizării produselor se constată că, în perioada 2022-2023, în cadrul **Obiectivului general 2** din totalul de 25 produse planificate, au fost realizate:

- **la obiectivul specific 2.1** – 1 produs nerealizat (25%, progres avansat – *acțiunea 2.1.1*) și 3 produse neinițiate (75%);
- **la obiectivul specific 2.2** – 3 produse sunt realizate (27% - *acțiunea 2.2.1*), 4 produse sunt în proces de realizare (36%), 1 produs nerealizat (9%, progres avansat - *acțiunea 2.2.2*) și 3 produse neinițiate (27%);
- **la obiectivul specific 2.3** – 5 produse sunt în proces de realizare (83%) și 1 produs nerealizat (17%, progres avansat *acțiunea 2.3.1*);
- **la obiectivul specific 2.4** – 2 produse sunt în proces de realizare (50%) și 2 produse neinițiate (50%).


Cu referire la acțiunile nerealizate menționăm:

Acțiunea 2.1.1 – IGSU al MAI, pe parcursul anului 2023, a accesat la 2 proiecte privind elaborarea studiului de fezabilitate a sistemului național de avertizare timpurie, care urmează a fi finalizate în perioada anilor 2024-2025, astfel acțiune fiind transferată pentru anul 2024.


Acțiunea 2.2.2 – Proiectul de ordin al MAI privind Conceptul de organizare a activității de prevenție a fost avizat pe intern cu Direcția juridică și Inspectoratul de Management Operațional al MAI. La moment, proiectul se află la etapa de aprobare de către ministrul afacerilor interne.

Acțiunea 2.3.1 – Pe parcursul anului 2023 s-au dus tratative cu experți polonezi și Asociația pompierilor voluntari din Austria în scopul acordării de suport pentru elaborarea conceptului, dar până la moment, nu au fost recepționate careva îndrumări sau un proiect de concept pentru a fi elaborat. La 24.11.2023, a fost aprobată Legea nr. 346 pentru modificarea Legii voluntariatului nr.121/2010. Drept rezultat al ultimelor modificări la Legea menționată, a apărut necesitatea de elabora o nouă Lege privind voluntariatul în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor. Propunerea dată a fost inclusă în Planul de activitate al IGSU pentru anul 2024 privind elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului (*Graficele nr. 9 și nr. 10, Tabelul nr. 11*).

Graficul nr. 9.

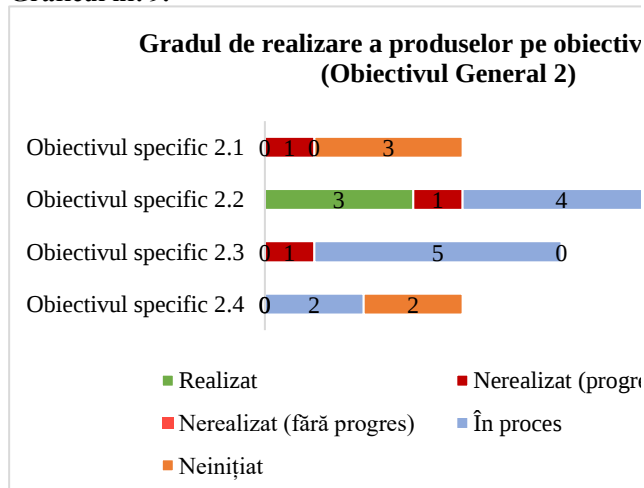

Graficul nr. 10.

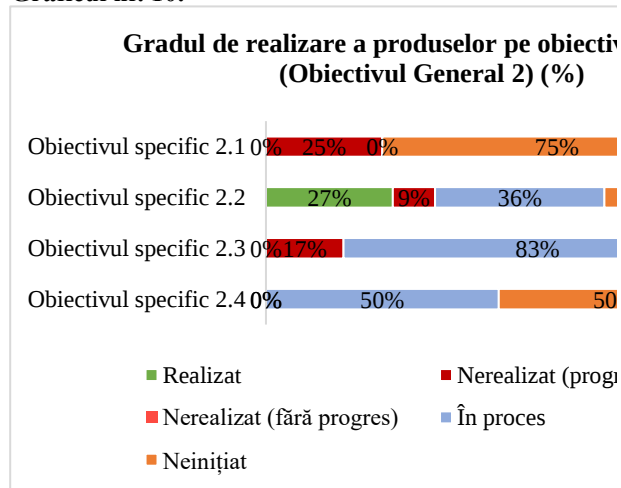

Tabelul nr. 11 Progresul și gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general 2.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
2.1. Operaționalizarea până în anul 2025 a sistemului național de avertizare timpurie	2.1.1. Elaborarea studiului de fezabilitate a sistemului național de avertizare timpurie	Studiu de fezabilitate și documentație tehnică a sistemului național de avertizare timpurie realizate	2500,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	Nerealizat (progres avansat) IGSU al MAI a accesat la 2 proiecte privind elaborarea studiului de fezabilitate a sistemului național de avertizare timpurie, după cum urmează: 1. Proiectul „Îmbunătățirea sistemului de reacționare la situații de urgență a Republicii Moldova prin implementarea unui sistem de avertizare timpurie”, realizat de către Uniunea Internațională pentru telecomunicații, în cadrul căruia, pe parcursul a șase luni ale anului 2023 a fost elaborat un studiu de pre-fezabilitate în care au fost examinate riscurile, nivelul de dezvoltare tehnologică a țării noastre, furnizorii de comunicații electronice, dar și s-a luat în vizor practica internațională în domeniu. Evenimentul de închidere a proiectului a avut loc la 26 ianuarie 2024 în incinta IGSU al MAI. 2. Proiectul UE UCPM-2023-TRACK1-IBA Technical Assistance for Disaster Risk Management (Track 1). Bugetul proiectului - 442 523 euro dintre care 8% cota RM. Durata proiectului 12 luni. Lansarea proiectului a avut loc la 28 februarie 2024. Urmare a elaborării studiului de fezabilitate menționat, IGSU al MAI va elabora conceptul sistemului național de avertizare timpurie și a Regulamentului de utilizare a sistemului național de avertizare timpurie, care vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern. Acțiune transferată pentru anul 2024
	2.1.2. Elaborarea conceptului sistemului național de avertizare timpurie	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	MAI (IGSU al MAI, Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe); Serviciul Tehnologia	Neinițiat După definitivarea și obținerea Studiului de fezabilitate va fi elaborat Conceptul tehnic al sistemului național de avertizare timpurie.

						Informației și Securitate Cibernetică; Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației	
	2.1.3. Elaborarea Regulamentului de utilizare a sistemului național de avertizare timpurie	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	MAI (IGSU al MAI, Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe); Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației	Neinițiat După obținerea studiului de fezabilitate menționat și odată cu lansarea sistemului vizat, va fi elaborat Regulamentul de utilizare a sistemului național de avertizare timpurie.
	2.1.4. Dezvoltarea sistemului național de avertizare timpurie a populației	Sistem dezvoltat și funcțional	55 000 – bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; 55 000,0 – surse externe	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; bugetul autorităților implicate;	Trimestrul IV, 2025	MAI (IGSU al MAI, Serviciul Tehnologii Informaționale); Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică;	Neinițiat. A fost inițiată negocierea cu reprezentanții Băncii Mondiale în scopul implementării Proiectului de Consolidare a Managementului Riscului de Dezastre și Rezilienței la Schimbările Climatice în Moldova (Moldova Disaster Risk Management and Climate Resilience Project) cu un buget total de 40 mln. dolari SUA, care prevede finanțarea dezvoltării sistemului național de avertizare timpurie a populației și consolidarea capacităților de intervenție.

			(Uniunea Europeană, NATO, România, Cehia, Franța)	surse externe		Agencia Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației	
2.2. Consolidarea activității de comunicare și informare preventivă	2.2.1. Desfășurarea campaniilor de informare și prevenire a situațiilor excepționale	Cel puțin 10 campanii de informare preventivă desfășurate	5 000,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	MAI (IGSU al MAI)	În proces Pe parcursul anului 2023 au fost desfășurate 11 campanii de informare și prevenire și anume: 1. Campania de prevenire a incendiilor în sectorul locativ în perioada rece a anului 2022-2023 (Dispoziția IGSU nr. 271/d din 31.10.2022); 2. Campania de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale în perioada Sărbătorilor de iarnă 2022-2023 (Dispoziția IGSU nr. 325/d din 14.12.2022); 3. Campania de minimizare a riscurilor de producere a cazurilor de explozii/incendii cauzate de exploatarea buteliilor cu gaz lichefiat și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale (Dispoziția IGSU nr. 20/d din 05.02.2021); 4. Campania cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a arderii vegetației uscate (Dispoziția IGSU nr. 59/d din 28.02.2023); 5. Campania cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență în perioada sărbătorilor de Sfintele Paști. (Dispoziția IGSU nr. 82d din 23.03.2023); 6. Campania cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a riscurilor de producere a incendiilor și a altor situații de urgență în perioada campaniei de recoltare a cerealelor și culturilor tehnice (Dispoziția IGSU nr. 135d din 31.05.2023); 7. Campania cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de pregătire a instituțiilor de odihnă către perioada estivală (Dispoziția IGSU nr. 122d din 18.05.2023); 8. Campania cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a înecurilor în perioada formării și menținerii podurilor de gheață în perioada rece 2022-2023 (Dispoziția IGSU nr. 329/d din 26.12.2022); 9. Campania cu privire la atenționarea entităților privind respectarea măsurilor anti incendiarie la obiectivele unde sunt

							amenajate centre de plasament ale refugiaților din Ucraina (Dispoziția IGSU nr. 38/d din 28.02.2022); 10. Campania cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență în instituțiile de învățământ pentru anul de studii 2022-2023 (Dispoziția IGSU nr. 197d din 23.08.2022); 11. Campania cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a incidentelor pe apă în perioada estivală (Dispoziția IGSU nr. 134/d din 30.05.2023).
		Cel puțin 100 000 de persoane informate și 30% de localități acoperite		Bugetul IGSU al MAI	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	Realizat Pe parcursul anului 2023 au fost informate și instruite - 698945 persoane. Campaniile de informare și prevenire s-au desfășurat în 95% dint totalul localităților din țară.
		Cel puțin 8 spoturi TV realizate		Bugetul IGSU al MAI	Trimestrul IV, 2025	MAI (IGSU al MAI)	În proces Pe parcursul anului 2023 - au fost realizate 5 spoturi video, precum și 1797 apariții în mass-media (ziar, radio, TV).
		Cel puțin 20 de materiale diseminate prin intermediul rețelelor de socializare		Bugetul IGSU al MAI	Trimestrul IV, 2025	MAI (IGSU al MAI)	Realizat Au fost plasate pe rețelele de socializare 35 materiale informative și de prevenție
		Cel puțin 4 echipamente tipografice procurate		Bugetul IGSU al MAI	Trimestrul IV, 2025	MAI (IGSU al MAI)	Realizat În cadrul Proiectului „Donare de echipament pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și instruire în domeniul comunicării pe timp de criză” a fost donat un lot de echipament tehnic necesar acțiunilor de prevenire și comunicare cu publicul (care a cuprins imprimante pentru pliante informative, laptop, camere de filmat și fotografiat, tabletă, dar și alte accesorii tehnice) în valoare totală de 22 de mii de dolari SUA (circa 400 de mii de lei MDL). Proiectul a fost implementat de Organizația Nonguvernamentală Transparency International-Moldova, fiind finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova.

	2.2.2. Elaborarea conceptului de organizare a activității de prevenire	Concept de organizare a activității de prevenire elaborat și aprobat (ordin al ministrului afacerilor interne aprobat)	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	Nerealizat (progres avansat) Proiectul de ordin al MAI privind Conceptul de organizare a activității de prevenire a fost avizat pe intern cu Direcția juridică și Inspectoratul de Management Operațional al MAI. La moment, proiectul se află la etapa de aprobare de către ministrul afacerilor interne.
	2.2.3. Crearea etapizată și operaționalizarea modulelor regionale mobile de prevenire	3 module mobile de prevenire operaționale	3 300,0 – bugetul IGSU al MAI; 3 300,0 – negocieri, asistență externă (Uniunea Europeană)	Bugetul IGSU al MAI; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	Neinițiat
	2.2.4. Elaborarea metodologiei naționale de evaluare a riscurilor situațiilor de urgență/exceptionale	Hotărâre a Guvernului aprobată	În limitele alocațiilor bugetare; negociere/asistență externă	Bugetul autorităților implicate; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	În proces Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Metodologiei în domeniul analizei prevenirii riscului de producere a situațiilor de urgență/ excepționale a fost elaborat și coordonat pe intern în cadrul IGSU. Totodată, a fost transmis partenerilor internaționali din cadrul Programului prevenire și răspuns la dezastre naturale și cele create de om în țările parteneriatului estic (PPRD-East) pentru obținerea expertizei internaționale.
		Metodologia existentă la nivel local revizuită	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	MAI (IGSU al MAI); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	Neinițiat Va fi inițiată urmare a aprobării metodologiei naționale de evaluare a riscurilor situațiilor de urgență/ excepționale
		Analiza riscurilor la nivel central și local efectuată	În limitele alocațiilor bugetare; negociere/asistență externă	Bugetul autorităților implicate; surse externe	Trimestrul IV, 2025	MAI (IGSU al MAI); Ministerul Infrastructurii și	Neinițiat

						Dezvoltării Regionale (Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică)	
	2.2.5. Instruirea copiilor/elevilor în instituțiile de învățământ privind situațiile de risc (riscurile situațiilor de urgență/excepționale)	Ore obligatorii privind cunoștințe de bază de prevenire a riscurilor și comportament sigur în situații de urgență și excepționale introduse în curriculumul școlar	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Educației și Cercetării	În proces Pe parcursul anului 2023 au fost desfășurate 6 activități de instruire, cu instruirea a 905 copii și 83 maturi. În cadrul Centrului republican de instruire au fost instruite 189 cadre didactice și 526 copii (elevi și studenți) din 12 instituții de învățământ, precum și 688 angajați ai întreprinderilor și instituțiilor.
2.3. Sporirea până în anul 2025 a gradului de integrare și implicare a voluntariatului în viața comunității	2.3.1. Elaborarea conceptului privind activitatea de voluntariat în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență și excepționale	Concept de dezvoltare a voluntariatului elaborat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) <i>Parteneri:</i> Congresul Autorităților Locale din Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Moldova; Solidarity Fund PL in Moldova	Nerealizat (progres avansat) Pe parcursul anului 2023 s-au dus tratative cu experți polonezi și Asociația pompierilor voluntari din Austria în scopul acordării de suport pentru elaborarea conceptului, dar până la moment, nu au fost recepționate careva îndrumări sau un proiect de concept pentru a fi elaborat. La 24.11.2023, a fost aprobată Legea nr. 346 pentru modificarea Legii voluntariatului nr.121/2010. Drept rezultat al ultimelor modificări la Legea menționată, a apărut necesitatea de elabora o nouă Lege privind voluntariatul în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor. Propunerea dată a fost inclusă în Planul de activitate al IGSU pentru anul 2024 privind elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului.

	2.3.2. Cooperarea cu organele administrațiilor publice centrale, locale, sectorul privat și asociativ în scopul dezvoltării voluntariatului în domeniu	Acorduri de cooperare cu autoritățile publice locale, sectorul privat și asociativ încheiate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces Pe parcursul anului 2023 au fost încheiate - 6 acorduri de parteneriat dintre APL și IGSU, după cum urmează: - la 09.01.2023, a fost semnat Acordul de parteneriat dintre APL Terebna, r-nul Edineț și IGSU, nr. 19/4-60 din 09.01.2023; - la 03.02.2023, a fost semnat Acordul de parteneriat dintre APL Fetești, r-nul Edineț și IGSU, nr. 19/4-285 din 03.02.2023; - la 02.05.2023, a fost semnat Acordul de parteneriat dintre APL Sireți, mun. Strășeni și IGSU, nr. 19/4-895 din 03.05.2023; - la 20.04.2023, a fost semnat Acordul de parteneriat dintre APL Consiliul Raional Telenesti și IGSU, nr. 19/4-923 din 05.05.2023, privind activitatea posturilor; - la 19.09.2023, a fost semnat Acordul de parteneriat dintre APL Etulia, UTA Găgăuzia și IGSU, nr. 19/4-2057 din 03.05.2023; - la 19.09.2023, a fost semnat Acordul de parteneriat dintre APL Căpriană, mun Strășeni și IGSU, nr. 19/4-2058 din 03.05.2023.
	2.3.3. Înființarea structurilor de salvatori și pompieri voluntari	Cel puțin 7 posturi de salvatori pompieri voluntari create; personal voluntar identificat și recrutat (70 de persoane)	În limitele alocațiilor bugetare; negociere/asistență externă	Bugetul autorităților implicate; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) <i>Parteneri:</i> Congresul Autorităților Locale din Moldova; autoritățile publice locale	În proces În trimestrul IV al anului 2022 au fost instituite 2 posturi teritoriale de salvatori și pompieri (s. Sărăteni, r-nul Hîncești, și s. Dezghingea, UTA Găgăuzia) Pe parcursul anului 2023 au fost instituite 2 posturi teritoriale de salvatori și pompieri (s. Etulia, UTA Găgăuzia (2 angajați civili) și s. Căpriană, r-nul. Strășeni (11 voluntari), și au fost donate de către Asociația pompierilor voluntari din Republica Austria 3 autospeciale pentru operaționalizarea viitoarelor posturi de salvatori și pompieri din localitățile Trebujeni, r-nul Orhei, Suhuluceni, r-nul Telenești și Cîrnățenii Noi, r-nul Căușeni. Totodată, au fost instruiți 72 de salvatori și pompieri din cadrul posturilor.
	2.3.4. Dotarea cu autospeciale a posturilor de voluntari	Posturile de voluntari dotate cu autospeciale	În limitele alocațiilor bugetare; negociere/asistență externă/donații	Bugetul autorităților implicate; surse externe; donații	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru	În proces În anul 2022, prin contracte de comodat de către IGSU au fost transmise în folosință temporară, cu titlu gratuit 4 autospeciale de intervenție (PSP de voluntari din s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești; PSP din s. Crasnoarmeiscoe, r-nul Hîncești;

		din contul donațiilor (7 autospeciale)				Situații de Urgență) <i>Parteneri:</i> autoritățile publice locale	Postul din s. Dezghingea UTA Găgăuzia; Postul din s. Etulia, UTA Găgăuzia). În anul 2023 au fost dotate cu echipament 4 posturi teritoriale de salvatori și pompieri (Persecina, Sireți, Cărpineni și Sărata Galbenă).
	2.3.5. Instruirea personalului voluntar	Cel puțin 250 de voluntari instruiți	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces În anul 2022 au fost instruiți 160 de pompieri voluntari. Pe parcursul anului 2023 au fost instruiți 10 formatori din cadrul IGSU în vederea implementării și dezvoltării voluntariatului în situații de urgență (curs de instruire desfășurat în Polonia). De asemenea, au fost instruiți 72 de salvatori și pompieri din cadrul posturilor teritoriale.
2.4. Creșterea calității procesului instituțional de expertiză în prevenirea situațiilor de urgență și excepționale	2.4.1. Dotarea laboratoarelor IGSU al MAI cu instalații, utilaj și echipamente	Echipamente, instalații și utilaje pentru activitatea de expertiză procurate (un set)	2 500,0 – bugetul IGSU al MAI; 2 500,0 – asistență externă (Uniunea Europeană)	Bugetul IGSU al MAI; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces Pe parcursul anului 2023, Laboratorul chimic-radiometric al IGSU a fost dotat cu echipament de laborator și de mentenanță.
	2.4.2. Instruirea angajaților în domeniul cercetării cazurilor situațiilor de urgență și excepționale, precum și în domeniul stabilirii indicilor tehnici ai materialelor și elementelor de construcție	Personal profesionist instruit (5 persoane/ specialiști)	500,0 – bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; 500,0 – asistență externă (Uniunea Europeană)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces În vederea asigurării continuității în procesul de dezvoltare a capacităților profesionale 2 angajați ai IGSU au participat la cursul de instruire „Operațiuni în caz de accidente chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) - exploatare și mentenanță echipament”, organizat de către Agenți de Apărare și Reducere a Amenințărilor (DTRA) a Departamentului de Apărare al SUA (suma finanțării nu se cunoaște)
	2.4.3. Acreditarea laboratoarelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență	Corespunderea cu cel puțin 3 standarde de calitate ISO	30,0 – bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru	Neinițiat

	al Ministerului Afacerilor Interne		Ministerului Afacerilor Interne; 70,0 – asistență externă (Uniunea Europeană)	Ministerului Afacerilor Interne; surse externe		Situații de Urgență)	
		Laboratoare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne acreditate (act de acreditare)	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	Neinițiat

3.3.3. Gradul de realizare a produselor privind Obiectivul general 3


Cu referire la produsele realizate în cadrul **Obiectivului general 3**, relevăm că, în perioada 2022-2023, au fost realizate:

- **la obiectivul specific 3.1** – 3 produse au fost realizate (50% - acțiunile 3.1.1, 3.1.2 și 3.1.3) și 3 produse sunt în proces de realizare (50%);
- **la obiectivul specific 3.2** – 1 produs a fost realizat (17% - acțiunea 3.2.3) și 5 produse sunt în proces de realizare (83%);
- **la obiectivul specific 3.3** – 5 produse sunt în proces de realizare (100%);
- **la obiectivul specific 3.4** – 4 produse sunt în proces de realizare (50%), 2 produse sunt nerealizate (25%, progres avansat – acțiunea 3.4.1) și 2 produse neinițiate (25%), (Graficele nr. 11 și 12 și Tabelul nr. 12).


Cu referire la acțiunea nerealizată menționăm:

Acțiunea 3.4.1 – a fost elaborată Analiza impactului de reglementare. La data de 31.07.2023, analiza impactului de reglementare, proiectul inițial al legii, însoțit de nota informativă și tabelul comparativ au fost expediate Cămarilor de Stat și Ministerului Finanțelor pentru examinare. La 08.08.2023, proiectul a fost examinat în ședința Grupului de lucru al Comisiei Naționale pentru reglementarea activității de întreprinzător. Acțiune transferată pentru anul 2024.

Graficul nr. 11.

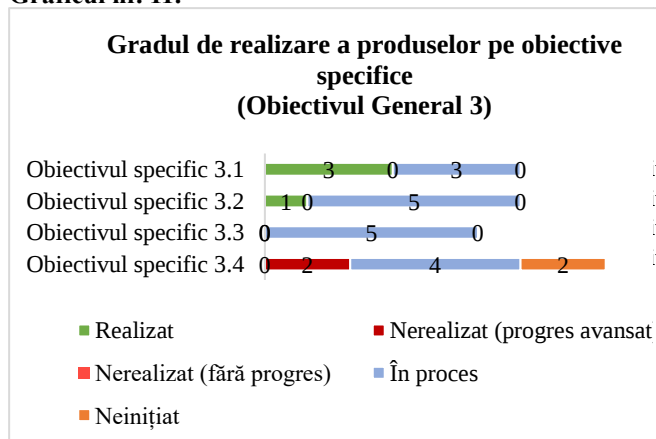

Graficul nr. 12.

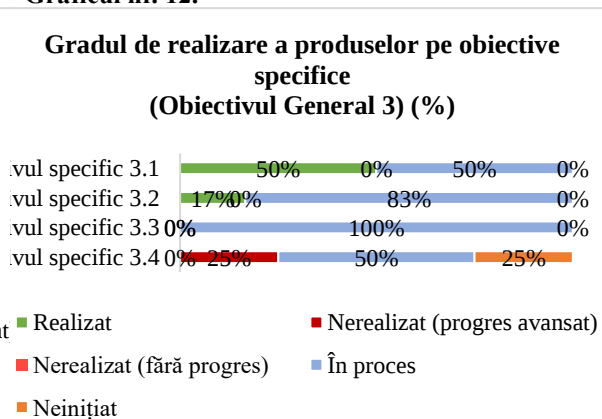

Tabelul nr. 12 Progresul și gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general 3

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres/narativ
3.1. Dezvoltarea capacităților naționale de pregătire și instruire în situații de urgență și excepționale	3.1.1. Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a clădirii Centrului de instruire al IGSU al MAI din satul Răzeni, raionul Ialoveni	Clădirea Centrului de instruire din satul Răzeni reconstruită/ renovată	Anii 2022-2024: 8 855,3 – bugetul IGSU al MAI; 19 677,2 – surse externe/grant (Uniunea Europeană)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	Realizat Pe parcursul anului 2022 au fost finalizate lucrările de reconstrucție a 1 bloc al CRI din s. Răzeni. În anul 2023 s-au efectuat lucrări de renovare interioară și exterioară a blocului central (administrativ) al CRI din loc. Răzeni, r-nul Ialoveni. Inaugurarea oficială a noului sediu al CRI al IGSU a avut loc la data de 22.12.2023, în prezența ministrului afacerilor interne.
	3.1.2. Înființarea, dotarea și amenajarea poligoanelor de instruire	Poligoane de instruire amenajate (3 poligoane /module)	28 000,0 – bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; 52 000,0 – asistență externă (Uniunea Europeană, NATO, România)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	Realizat În perioada trimestrul IV 2022 - anul 2023 s-au realizat: 1. A fost creat complexul multifuncțional de pregătire a pompierilor și salvatorilor „Modul multi-container pentru operațiuni de salvare”, în cadrul proiectului Moldo-Polonez „Suport pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova”. 2. A fost creat și dotat modulul de instruire în domeniul acordării primului ajutor, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea timpului de reacție pentru situații de urgență în zona transfrontalieră prin renovarea infrastructurii pentru instruirea populației” 2SOFT/45/85. 3. A fost creat modulul de instruire „Gestionarea și răspunsul la dezastre” pentru factorii de decizie la nivel local cu privire la răspunsul și gestionarea situațiilor de urgență. 4. A fost creat modulul de instruire privind comunicațiile în standardul TETRA din cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacităților de comunicare bazate pe TIC în zona transfrontalieră de Nord-Est România – Republica Moldova” 1HARD/3.1/95/1.

		Echipamente și utilaje de pregătire procurate (3 seturi)	1 600,0 – bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; 14 400,0 – negocieri, asistență externă (Uniunea Europeană, România)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	Realizat Au fost achiziționate/donate 3 seturi de echipamente, după cum urmează: a) Materiale medicale și manechine, pentru instruirea în domeniul primului ajutor. b) Echipament special, (echipamente de descarcerare, de alpinism, costume de luptă de divers tip, stații radio, troliu) necesar la desfășurarea activităților de instruire în complexul multifuncțional. c) Echipament de instruire privind comunicațiile în standard TETRA (calculatoare, stații tetra mobile, stații tetra portabile, soft de instruire, imprimante, video-proiectoare, tabla interactivă, etc).
	3.1.3. Elaborarea programelor de instruire și a curricula de studii	Cel puțin 12 programe modulare de pregătire și instruire în situații de urgență elaborate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces 1. A fost elaborată curricula de instruire în domeniul protecției civile a conducătorilor autorităților locale, în cadrul proiectului „Creșterea protecției populației în situațiile de urgență cauzate de dezastre naturale în zona transfrontalieră”, 2SOFT/4.2/71. 2. A fost elaborată curricula „Stagiu de instruire privind comunicațiile în standardul TETRA pentru personalul IGSU al MAI”, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacităților de comunicare bazate pe TIC în zona transfrontalieră de Nord-Est România – Republica Moldova” 1HARD/3.1/95/1. 3. A fost elaborată curricula „Formarea inițială a personalului serviciului teritorial de salvatori și pompieri”, în cadrul proiectului „Consolidarea sistemului de protecție civilă în Republica Moldova” cu suportul Solidarity Fund PL în Moldova.
	3.1.4. Planificarea și desfășurarea sesiunilor de instruire a personalului de specialitate din cadrul	Cel puțin 300 de angajați din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului	Anul 2023 – 1 000,0; anul 2024 – 1 000,0; anul 2025 – 1 000,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces Pe parcursul anului 2023 au fost instruiți 771 angajați, și anume: - 90 angajați - cursuri de formare inițială; - 462 angajați - cursuri de formare continuă; - 100 angajați instruiți în cadrul Centrului de antrenament și pregătire de specialitate din mun. Iași (proiect SMURD 2);

	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Afacerilor Interne instruiți					- 8 angajați - curs de formare continuă la Centrul național de perfecționare a pregătirii pentru managementul situațiilor de urgență, or. Ciolpani, România; - 51 de angajați au participat la 11 cursuri de instruire peste hotarele țării.
	3.1.5. Instruirea angajaților și populației pentru acordarea primului ajutor calificat	Cel puțin 60 de angajați și 200 de persoane instruite pentru acordarea primului ajutor calificat	Anul 2023 – 1 000,0; anul 2024 – 1 000,0; anul 2025 – 1 000,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces Pe parcursul anului 2023 au fost desfășurate instruiți în domeniul acordării primului ajutor calificat pentru: - 769 persoane din rândul populației ; - 13 angajați IGSU (86%).
3.2. Valorificarea oportunităților de participare la instruire/exerciții pe plan internațional	3.2.1. Participarea angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne în cadrul Programului de instruire al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene	Participarea la cel puțin 2 cursuri anual	În limitele alocațiilor bugetare, surse externe	Bugetul IGSU al MAI; surse externe (Programul de instruire al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene)	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces Pe parcursul anului 2023 6 angajați ai IGSU au participat la 3 cursuri de instruire, și anume: 1) Curs de introducere în Mecanismul de protecție civilă al UE - 1 angajat; 2) Curs de instruire la nivel înalt în cadrul programului PPRD East-3, or. Bruxelles, Belgia - 4 angajați; 3) Curs de introducere în EUCPM pentru punctele naționale de contact, or. Bruxelles, Belgia - 1 angajat;
		Numărul exercițiilor de teren la care s-a participat		Bugetul IGSU al MAI; surse externe (Programul de instruire al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene)	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces În anul 2023, 112 angajați au participat în cadrul a 6 exerciții de tip TTX și FSX desfășurate în Georgia, Norvegia, Republica Polonă, România. Cheltuielile suportate de către partenerii de dezvoltare nu pot fi identificate.
		Cel puțin 8 angajați instruiți		Bugetul IGSU al MAI; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne	În proces Pe parcursul anului 2023 6 angajați ai IGSU au participat la 3 cursuri de instruire, și anume:

				(Programul de instruire al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene)		(Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	1) Curs de introducere în Mecanismul de protecție civilă al UE - 1 angajat; 2) Curs de instruire la nivel înalt în cadrul programului PPRD East-3, or. Bruxelles, Belgia - 4 angajați; 3) Curs de introducere în EUCPM pentru punctele naționale de contact, or. Bruxelles, Belgia - 1 angajat.
	3.2.2. Desfășurarea exercițiilor internaționale în Republica Moldova	Cel puțin un exercițiu anual desfășurat; cel puțin 100 de participanți la exerciții	Anul 2023 – 450,0; anul 2024 – 450,0; anul 2025 – 450,0 bugetul IGSU al MAI; <u>anul 2023</u> – 450,0 asistență externă (Uniunea Europeană, NATO); <u>anul 2024</u> – 450,0 asistență externă (Uniunea Europeană, NATO); <u>anul 2025</u> – 450,0 asistență externă (Uniunea Europeană, NATO)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	În proces În cadrul exercițiilor desfășurate pe parcursul anului 2023 au participat 332 persoane.
	3.2.3. Participarea și organizarea schimbului de experiență și bune practici	Cel puțin o vizită de studiu desfășurată	În limitele alocațiilor bugetare; surse externe	Bugetul IGSU al MAI; surse externe (Programul de instruire al Mecanismului de Protecție Civilă al	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	Realizat Pe parcursul anului 2023 - 37 angajați ai IGSU au participat la 11 vizite de lucru, vizite de studiu și schimb de experiență în Japonia, Polonia, Regatul Țărilor de Jos, Franța, Lituania, România, Azerbaidjan.

				Uniunii Europene)			
3.3. Fortificarea capacităților grupurilor-țintă (populației, autorităților administrației publice, sectorului privat, asociativ și voluntar) în gestionarea situațiilor de urgență și excepționale	3.3.1. Elaborarea planurilor de instruire/pregătire în domeniul protecției civile	7 planuri de pregătire pentru fiecare categorie de audienți elaborate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces În anul 2022 a fost elaborat și aprobat 1 plan / curriculum de instruire în domeniul protecției civile a conducătorilor autorităților publice locale. Pe parcursul anului 2023 au fost elaborate - 2 Programe de instruire privind pregătirea inițială a subofițerilor și ofițerilor din cadrul IGSU
	3.3.2. Organizarea și desfășurarea procesului de instruire/pregătire pentru reprezentanții autorităților publice centrale, sectorului privat și asociativ și voluntar	Audienți din cadrul autorităților publice locale, autorităților publice centrale, sectorului privat și asociativ instruiți (minimum 1 500 de persoane anual)	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces În anul 2022 de către Centrul republican de instruire au fost realizate: - întru executarea Planului de completare cu audienți pentru anul 2022 (HG 420/2021) au fost instruite 2728 persoane; - la solicitarea întreprinderilor și instituțiilor au fost instruiți 315 angajați; - întru realizarea prevederilor HG nr. 960/2016 au fost instruiți administratori și persoane responsabile de apărarea împotriva incendiilor din întreprinderi și instituții – 292 persoane. În anul 2023 de către Centrul republican de instruire au fost realizate: - întru executarea Planului de completare cu audienți pentru anul 2023 (HG 823/2022) au fost instruite 2555 persoane; - la solicitarea întreprinderilor și instituțiilor au fost instruiți 769 angajați; - întru realizarea prevederilor HG nr. 960/2016 au fost instruiți administratori și persoane responsabile de

							apărarea împotriva incendiilor din întreprinderi și instituții – 448 persoane.
	3.3.3. Acordarea suportului autorităților publice locale în actualizarea strategiilor și planurilor pentru gestionarea situațiilor de urgență și excepționale	Suport consultativ în elaborarea strategiilor și planurilor pentru gestionarea situațiilor de urgență și excepționale acordat autorităților publice locale (număr de acte departamentale de suport elaborate, număr de ședințe de lucru desfășurate)	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); autoritățile publice locale <i>Parteneri:</i> Congresul Autorităților Locale din Moldova	În proces 1. Organizarea, în perioada 01-02.03.2023, a vizitei de lucru în zonele cu risc sporit de producere a incendiilor de vegetație din mun. Soroca în comun APL și reprezentanții din cadrul programului PPRD EAST-3. 2. Participarea, la 03.03.2023, la ședința grupului de lucru dintre reprezentanții programului PPRD East-3 și Serviciul Hidrometeorologic de Stat privind posibilitatea implementării buletinelor meteorologice. 3. A fost studiat modelul de buletin meteorologic (IBF W 2023) pentru implementarea pe teritoriul municipiului Soroca. 4. Organizarea și desfășurarea Atelierului de lucru „Planificarea de Urgență pentru zona-pilot mun. Soroca” (13-17.11.2023).
	3.3.4. Desfășurarea exercițiilor, aplicațiilor practice de protecție civilă cu antrenarea autorităților publice locale, autorităților publice centrale, sectorului privat și asociativ	Cel puțin 10 exerciții, aplicații practice și de Stat Major anual cu antrenarea autorităților publice locale, autorităților publice centrale, sectorului privat și asociativ desfășurate;	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; bugetele autorităților publice locale	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces În anul 2023 au fost desfășurate: - 7 aplicații cu antrenarea APL și APC în mun. Bălți și raioanele Ocnîța, Rîșcani, Singerei, Florești, Strășeni și Nisporeni cu antrenarea a 1135 persoane; - 1 Exercițiu de Stat Major (TTX) ”Consolidarea capacităților de prevenire, pregătire și răspuns a administrației publice centrale și entităților publice responsabile de gestionarea situațiilor de urgență și excepționale”, au participat 58 persoane din 14 autorități publice centrale și 2 organizații internaționale (UNHCR și OIM). De asemenea, în anul 2023 au fost desfășurate 10 exerciții tactice, cu antrenarea a 418 persoane/angajați din 10 instituții și întreprinderi.

		Cel puțin 400 de persoane antrenate					În proces În cadrul aplicațiilor și exercițiilor desfășurate pe parcursul anului 2023 au fost antrenate 1 611 persoane.
3.4. Eficientizarea până în anul 2025 a activității de administrare și consolidare a capacității rezervelor de stat și de mobilizare	3.4.1. Ajustarea cadrului normativ în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare	Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare elaborat și aprobat de Guvern	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (Serviciul politici în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare, Agenția Rezerve Materiale)	Nerealizat A fost elaborată Analiza impactului de reglementare. La data de 31.07.2023, analiza impactului de reglementare, proiectul inițial al legii, însoțit de nota informativă și tabelul comparativ au fost expediate Cancelariei de Stat și Ministerului Finanțelor pentru examinare. La 08.08.2023, proiectul a fost examinat în ședința Grupului de lucru al Comisiei Naționale pentru reglementarea activității de întreprinzător. Acțiune transferată în anul 2024.
		Nomenclatoarele bunurilor materiale din rezervele de stat și rezervele de mobilizare actualizate și aprobate de Guvern	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestrul IV, 2023	MAI (Serviciul politici în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare, Agenția Rezerve Materiale); Ministerul Sănătății (Agenția Națională pentru Sănătate Publică)	Nerealizat Proiectul elaborat a fost supus avizării repetate. Acțiune transferată pentru anul 2024
	3.4.2. Completarea rezervelor de stat și de mobilizare cu bunuri materiale corespunzătoare necesităților de intervenție în situații de urgență/excepționale și de recuperare	Nivelul de completare a rezervelor de stat cu cel puțin 8% anual	Rezerva de stat: <u>anul 2023</u> – 118 700,0; <u>anul 2024</u> – 118 600,0; <u>anul 2025</u> – 114 700,0	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Agenția Rezerve Materiale)	În proces Conform planului de acumulare pentru anul 2023 au fost efectuate procurări de bunuri în sumă de 416688,9 mii lei Nivelul de completare a rezervelor de stat este de 65,1%
		Nivelul de completare a rezervelor de	Rezerva de mobilizare:	Bugetul Agenției	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne	În proces

		mobilizare cu cel puțin 8 % anual	anul 2023 – 2 300,0; anul 2024 – 2 300,0; anul 2025 – 2 400,0	Rezerve Materiale		(Agenția Rezerve Materiale)	Pe parcursul anului 2023, au fost acumulate bunuri în rezervele de mobilizare, bunuri în sumă de 2436,1 mii lei. La etapa actuală, nivelul de completare a bunurilor materiale din rezervele de mobilizare, constituie circa 77 %.
	3.4.3. Dezvoltarea infrastructurii depozitelor Agenției Rezerve Materiale	Depozite din gestiunea Agenției Rezerve Materiale reparate	Anul 2023 – 3000,0; anul 2024 – 3000,0	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestru I IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Agenția Rezerve Materiale)	În proces Pentru anul 2023, au fost inițiate 3 proceduri de achiziții privind lucrările de reparații a depozitelor (Depozitul principal, depozitul nr. 4 și Depozitul nr. 5).
		Bază de produse petroliere cu capacitatea de păstrare a unui volum de 30 mii de tone construită	Anul 2023 – 50 000,0; anul 2024 – 50 000,0; anul 2025 – 50 000,0	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Agenția Rezerve Materiale)	În proces Studiu efectuat, la moment se identifică terenul.
	3.4.4. Instruirea angajaților Centrului de gestionare rezervelor materiale ale statului în scopul eliberării operative a bunurilor în situații excepționale/de urgență	Plan operativ de intervenții privind eliberarea bunurilor în situații excepționale/de urgență elaborat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Agenția Rezerve Materiale)	Neinițiat
		2 antrenamente, cu generalizarea rezultatelor acestora, efectuate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Agenției Rezerve Materiale	Trimestrul IV, 2024	MAI (Agenția Rezerve Materiale)	Neinițiat

3.3.4. Gradul de realizare a produselor privind Obiectivul general 4


Evaluarea gradul de realizare a produselor aferente **Obiectivului general 4** a constatat că, în perioada 2022-2023, din totalul de 19 produse planificate, au fost realizate:

- **la obiectivul specific 4.1** – 5 produse sunt în proces de realizare (83%) și 1 produs neinițiat (17%);
- **la obiectivul specific 4.2** – 3 produse sunt în proces de realizare (100%);
- **la obiectivul specific 4.3** – 4 produse sunt în proces de realizare (80%) și 1 produs neinițiat (20%);
- **la obiectivul specific 4.4** – 4 produse sunt în proces de realizare (80%) și 1 produs nerealizat (20%, fără progres – *acțiunea 4.4.1*) (*Graficele nr. 13, 14 și Tabelul nr. 13*).


Cu referire la acțiunea nerealizată menționăm:

Acțiunea 4.4.1 - odată cu implementarea Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, IGSU (SMURD) din motive nedefinite nu este implicat în intervențiile comune, cu toate că se regăsește în Indexul de cooperare și intervenție / indexul de caz dintre echipajele de intervenție de urgență ale Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne.

Graficul nr. 13.

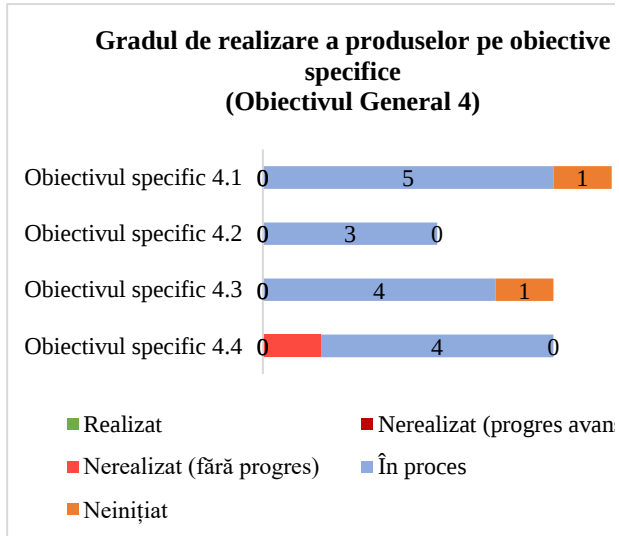

Graficul nr. 14.

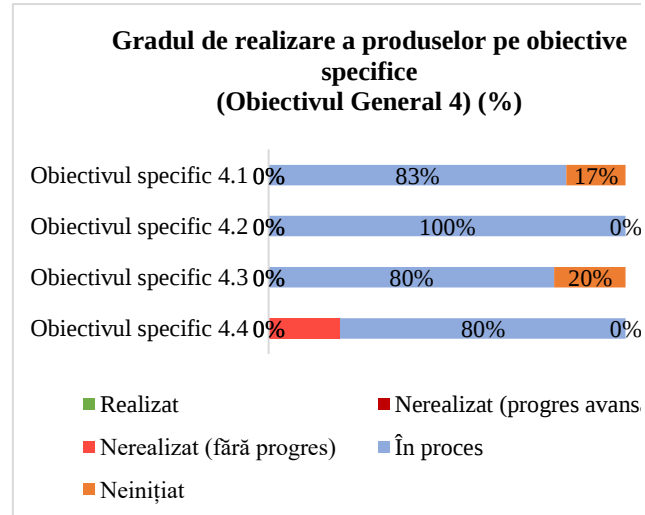

Tabelul nr. 13 Progresul și gradul de realizare a produselor pentru Obiectivul general 4.

Obiectivul specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Costuri de implementare (mii lei)	Sursa de finanțare	Termen de realizare	Instituție responsabilă și Parteneri	Progres
4.1. Crearea până în anul 2025 a condițiilor de muncă de calitate înaltă pentru a stimula creșterea eficienței angajaților din domeniul situațiilor de urgență și excepționale	4.1.1. Revizuirea analizei/conceptului de dezvoltare a domeniului intervențiilor/de răspuns	Analiza/conceptul revizuit(ă) și aprobat(ă) prin ordin al ministrului afacerilor interne	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	Neinițiat
	4.1.2. Renovarea structurilor/sediilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	2 structuri/sedii renovate anual	Anul 2023 – 6 000,0; anul 2024 – 6 000,0; anul 2025 – 6 000,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces Pe parcursul anului 2023 au fost renovate / construite 2 puncte de operare terestră SMURD în orașele Ungheni (EU- 8788,9 mii lei, Guvernul RM- 878,0 mii lei) și Cantemir (EU- 5027,7 mii lei, Guvernul RM- 502,0 mii lei). În scopul construcției PSP Holercani pe parcursul anului 2023 a fost elaborat proiectul tehnic (200 mii lei).
	4.1.3. Reconstruirea și/sau construirea sediilor de salvatori și pompieri	6 remize de salvatori și pompieri construite/reconstruite	Anii 2024-2025: 7 200,0 – bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces Pe parcursul anului 2022 au fost finalizate lucrările de construcție a 2 sedii a remizelor de pompieri și salvatori din or. Ștefan Vodă și or. Ungheni. Unitatea de salvatori și pompieri din or. Ungheni, operaționalizată în anul 2022. Această investiție a fost completată

			Afacerilor Interne; 70 000,0 (3,5 mil. dolari SUA) – asistență externă din proiecte de asistență tehnică în cadrul Programului de asistență umanitară al Departamentului Apărării SUA				cu un proiect suplimentar finanțat din fondurile UE. Construit cu suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Unitatea de salvatorii și pompierii din or. Ștefan Vodă a fost operaționalizată în decembrie 2022, de asemenea fiind construită cu suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii. În anul 2023 a fost construit și operaționalizat Dispeceratul Integrat pentru situații de urgență NORD. Prin această investiție a fost substanțial îmbunătățit procesul de gestionare a situațiilor de urgență pentru toată zona nordică a țării, având în vedere faptul, că acest Dispecerat deservește apelurile de urgență din mun. Bălți și 11 raioane din nord. Pe parcursul anului 2023, au continuat lucrările de construcție a USP Șoldănești, se planifică darea în exploatare în anul 2024. Totodată, au fost demarate lucrările de construcție a USP Ocnîța, Dondușeni și Căinari, se planifică finalizarea lucrărilor la finele anului 2024.
	4.1.4. Operaționalizarea structurilor de salvatori și pompieri construite/înființate	Număr de echipamente și utilaje procurate	Anul 2023 – 1 500,0; anul 2024 – 1 500,0; anul 2025 – 1 500,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces Pe parcursul anului 2022 au fost achiziționate: - 125 furtunuri de refulare distribuite în 18 subdiviziuni; - 60 Trackere GPS distribuite în 13 subdiviziuni. Pe parcursul anului 2023: - au fost achiziționate 187 furtunuri de stingere a incendiilor și distribuite în 18 subdiviziuni ale Inspectoratului; - au fost achiziționate 114 trackere GPS dintre care, 106 au fost instalate la unitățile de tehnică în 13 subdiviziuni.

	4.1.5. Securizarea energetică a structurilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Cel puțin 5 structuri securizate I	Anul 2023 – 7 000,0; anul 2024 – 7 000,0; anul 2025 – 7 000,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces În anul 2022 au fost securizate energetic 4 structuri ale IGSU după cum urmează: SSE Ștefan Vodă, sediul central al IGSU, mun. Chișinău, DSE mun. Soroca, DRCS nr.1 mun. Chișinău. În lipsa alocării mijloacelor financiare în anul 2023, securizarea energetică a structurilor IGSU nu a fost inițiată. Pentru anul 2024 este preconizat de instalat sisteme de securizare energetică în 5 unități: SSE Cimișlia, SSE Ocnița, SSE Dondușeni, SSE Căinari, SSE Șoldănești.
	4.1.6. Antrenarea voluntarilor în misiunile de intervenție	Cel puțin 120 de voluntari antrenați în misiuni de intervenție	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) <i>Parteneri:</i> autoritățile publice locale	În proces Pe parcursul anului 2022 s-a intervenit la 620 intervenții, în care au fost antrenați 142 voluntari din 18 Posturi teritoriale de salvatori și pompieri. Pe parcursul anului 2023, s-a intervenit în 1712 intervenții, în care au fost antrenați 355 voluntari din 64 de Posturi teritoriale de salvatori și pompieri. Acțiunea nu presupune costuri din partea IGSU, deoarece costurile acestora sunt acoperite de către autoritățile administrației publice locale.
4.2. Asigurarea până în anul 2025 a condițiilor conforme normelor pentru toate tipurile de intervenții	4.2.1. Procurarea autospecialelor de intervenție	58 de autospeciale procurate (49 de autocisterne și 9 autoscări)	Anul 2023 – 255 200,0; anul 2024 – 255 200,0; anul 2025 – 255 200,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces La 20.01.2023 în or. Tokyo conducerea IGSU, reprezentată de șeful Inspectoratului, a semnat contractul între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI din Republica Moldova și compania „Toyota Tsusho Corporation” din Japonia. Acesta prevede fabricarea și livrarea în Republica Moldova a 19 autospeciale pentru salvatori și pompieri: - 8 autoscări cu lungimea de 30 m; - 2 autoscări cu lungimea de 54 de m;

							- 3 autocisterne cu capacitatea de 3 000 litri; - 4 autocisterne cu capacitatea de 4 000 litri; - 2 autocisterne cu capacitatea de 10 000 litri. Tehnica produsă în Japonia va fi bazată pe șasiu european și urmează a fi livrată în Republica Moldova într-un termen de 23 de luni.
	4.2.2. Procurarea echipamentelor de protecție	Echipamente de protecție procurate (120 de seturi anual)	Anul 2023 – 9 700,0; anul 2024 – 9 700,0; anul 2025 – 9 700,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces În anul 2022 au fost achiziționate și repartizate efectivului de pompieri din cadrul subdiviziunilor IGSU: - 66 seturi Aparate izolante cu aer comprimat pentru respirație; - 182 buc căști de protecție pentru pompieri; - 400 seturi costume de protecție pentru pompieri; - 400 buc. Cagule pentru pompieri; - 400 buc 3stimat de siguranță pentru pompieri. Setate - 182 seturi În anul 2023 au fost achiziționate și repartizate efectivului de pompieri din cadrul subdiviziunilor IGSU: - 450 costume de protecție pentru pompieri cu mănuși și jambiere; - 250 căști de protecție pentru pompieri (creștere cu 53%); - 450 centuri de siguranță pentru pompieri (creștere cu 44%); - 250 cagule pentru pompieri (creștere cu 25%). Setate – 250 seturi.
	4.2.3. Procurarea echipamentelor de suport logistic pentru misiuni externe	Echipamente de suport logistic procurate (un set)	Anul 2023 – 2 500,0; anul 2024 – 2 500,0;	Bugetul IGSU al MAI	Trimestrul IV, 2025	MAI (IGSU)	În proces În anul 2023 au fost valorificați 2 000 000 lei alocați către DRCS nr. 2 pentru procurarea echipamentului de suport logistic al Echipei USAR Moldova

			anul 2025 – 2 500,0				
4.3. Dezvoltarea capacității de furnizare a asistenței internaționale în materie de protecție civilă	4.3.1. Operaționalizarea modulului de pompare de mare capacitate	Modul de pompare de mare capacitate operaționalizat (număr de angajați instruiți, număr de echipamente procurate)	5 500,0 – bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; 5 500,0 – negocieri, asistență externă (Uniunea Europeană)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	MAI (IGSU)	În proces Pe parcursul anilor 2022-2023: 1) a fost evaluată capacitatea subdiviziunilor IGSU pentru identificarea resurselor umane și tehnice pentru formarea Modulului de pompare de mare capacitate (HCP); 2) a fost formată structura și componenței Modulului HCP; 3) a fost estimată capacitatea și componența echipei pre-selectate pentru formarea Modulului HCP prin participarea la: • Exercițiul internațional de teren „EU Modex Sibiu 2022”; • Exercițiul de teren la scară largă „Euro-Med-React 2023”.
	4.3.2. Operaționalizarea modulului USAR (Urban Search and Rescue)	Modul USAR (Urban Search and Rescue) operaționalizat (număr de cursuri de pregătire realizate, număr de persoane instruite, număr de dotări procurate)	30 800,0 – bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; 30 800,0 – negocieri, asistență externă (Uniunea Europeană), Solidarity Fund (Polonia)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces La modulul USAR (Urban Search and Rescue): - a fost aprobat/actualizat cadrul normativ al modulelor; - au fost instruiți 11 angajați cu funcții de conducere din cadrul echipei USAR, în perioada 24-28 iulie 2023, cu suportul Fundației „Solidarity Fund PL” și Institutul „iHELP” din Republica Polonă. Cursul de instruire privind utilizarea Sistemului de coordonare și management INSARAG „ICSM management tools” și a platformei Virtual OSOCC. - au fost instruiți 10 angajați cu funcții de conducere din cadrul echipei USAR, în perioada 10-13 octombrie 2023, cu suportul Fundației „Solidarity Fund PL” și Institutul „iHELP” din Republica Polonă. Cursul de instruire privind utilizarea Sistemului de coordonare și

							management INSARAG, funcționalitatea RDC și UCC. Cursurile de instruire au fost suportate de către Guvernul Poloniei, prin intermediul Fundației Solidarity Found PL in Moldova, cheltuielile nu pot fi identificate. În perioada 22-24 noiembrie 2023 s-a desfășurat exercițiul de testare a procesului de clasificare externă echipei de căutare – salvare urbană USAR MOLDOVA. Capacitățile de funcționare a modulelor au fost testate în timpul misiunii de acordare a sprijinului autorităților turcești la efectuarea operațiunilor de căutare-salvare urbană în urma cutremurului de pământ, în perioada 06-17 februarie 2023 și la Exercițiul regional de teren la scară largă TbiEX Georgia 2023, în perioada 10-21 iunie 2023
	4.3.3. Operaționalizarea submodulului de suport logistic pentru realizarea misiunilor externe	Submodul de suport logistic creat (număr de angajați instruiți, număr de echipamente procurate)	19 800,0 – bugetul IGSU al MAI; 19 800,0 – negocieri, asistență externă (UE)	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces Capacitățile de funcționare a modului au fost testate în timpul misiunii de acordare a sprijinului autorităților turcești la efectuarea operațiunilor de căutare-salvare urbană în urma cutremurului de pământ, în perioada 06-17 februarie 2023 și la Exercițiul regional de teren la scară largă TbiEX Georgia 2023, în perioada 10-21 iunie 2023.
	4.3.4. Operaționalizarea echipei de asistență și suport tehnic	Echipă de asistență și suport tehnic creată și dotată cu echipamente	5 500,0 – bugetul IGSU al MAI; 5 500,0 – negocieri, asistență externă (Uniunea Europeană)	Bugetul IGSU al MAI; surse externe	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	Neinițiat

	4.3.5. Crearea rezervei naționale de experți în protecție civilă	Cel puțin 8 persoane identificate și instruite	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul IGSU al MAI	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces Pe parcursul anului 2023 6 angajați ai IGSU au participat la 3 cursuri de instruire, și anume: 1) curs de introducere în Mecanismul de protecție civilă al UE – 1 angajat; 2) curs de instruire la nivel înalt în cadrul programului PPRD East-3, or. Bruxelles, Belgia – 4 angajați; 3) curs de introducere în EUCPM pentru punctele naționale de contact, or. Bruxelles, Belgia – 1 angajat.
4.4. Sporirea până în anul 2024 a rezilienței la situații care pun în pericol sănătatea oamenilor	4.4.1. Elaborarea și aprobarea unui ordin comun al ministrului afacerilor interne și ministrului sănătății privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească	Ordin comun elaborat și aprobat	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Sănătății	Nerealizat (fără progres) Odată cu implementarea Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, IGSU (SMURD) din motive nedefinite nu este implicat în intervențiile comune, cu toate că se regăsește în Indexul de cooperare și intervenție / indexul de caz dintre echipajele de intervenție de urgență ale Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne.
	4.4.2. Elaborarea regulamentelor și a procedurilor de cooperare a serviciilor medicale de urgență naționale cu SMURD	Cel puțin un regulament și 2 proceduri de cooperare a serviciilor medicale de urgență naționale cu SMURD aprobate	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență); Ministerul Sănătății	În proces 1. Regulamentul privind procedura de efectuare a misiunilor transfrontaliere cu ambulanțele Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD), aprobat prin HG nr. 675/2023; 2. Regulamentul de activitate a echipajelor de prim ajutor calificat a Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare (Ordinul IGSU nr. 297 din 21.12.2023).
	4.4.3. Ajustarea de comun cu Ministerul Sănătății a procedurilor și mecanismelor necesare privind antrenarea echipajelor SMURD la apelurile de	Proceduri și mecanisme necesare privind antrenarea echipajelor SMURD la apelurile de	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul autorităților implicate	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență);	În proces A fost aprobată 1. Procedura de operare comună privind preluarea, transportarea și predarea unor preparate medicamentoase la solicitarea Ministerului Sănătății sau a Departamentului pentru Situații de

	urgență ale cetățenilor pentru acordarea primului ajutor calificat	urgență ale cetățenilor pentru acordarea primului ajutor calificat, ajustate în comun cu Ministerul Sănătății				Ministerul Sănătății	Urgență din România în caz de urgențe medicale (Ordinul MAI nr. 202 din 25.07.2022).
		Număr de intervenții desfășurate în acordarea serviciilor de prim ajutor medical calificat cetățenilor	În limitele alocațiilor bugetare	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2024	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces Pe parcursul anului 2022 au fost desfășurate 21 intervenții SMURD, dintre care: Pe parcursul anului 2023 au fost desfășurate 16 intervenții SMURD, dintre care: - misiuni primare – 1; - misiuni secundare – 14; - misiuni transfrontaliere – 4, și anume: - din Bulgaria în Republica Moldova, la data de 11.01.2023; - din Polonia în Republica Moldova, ca urmare a solicitării parvenite la data de 02.02.2023; - din România în Republica Moldova, la data de 24.02.2023; - din România în Republica Moldova, la data de 30.08.2023. Motivarea privind riscul neîndeplinirii acțiunii: a) odată cu implementarea Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112, serviciul SMURD al IGSU din motive nedefinite continuă a nu fi implicat în intervențiile comune, cu toate că se regăsește în Indexul de cooperare și intervenție/indexul de caz dintre echipajele de intervenție de urgență ale Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne;

							b) sistarea totală din anul 2017 a activității echipajelor SMURD din cadrul intervențiilor comune, în deosebi a celor cu Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP); c) lipsa funcțiilor de paramedic pentru operaționalizarea echipajelor de prin ajutor calificat SMURD din cadrul IGSU al MAI (stoparea modificării HG 137/2019), din care considerente indicatorul planificat de 6000 de intervenții nu poate fi atins.
	4.4.4. Instruirea formatorilor de paramedici	50 de formatori de paramedici instruiți	Anul 2023 – 275,0; anul 2024 – 275,0; anul 2025 – 275,0	Bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Trimestrul IV, 2025	Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență)	În proces Pe parcursul anului 2022 au fost instruiți 52 angajați ai IGSU din cadrul DSE Bălți, DSE Soroca, DRCS nr. 2, CDIO "Nord" și CDIO "Sud". Pe parcursul anului 2023, au fost desfășurate 2 cursuri de instruire: 1) curs de instruire în cadrul Centrului Național de Formare Formatori al ISU jud. Mureș, România, în vederea obținerii calificării formator de paramedici, în perioada 04.09-24.11.2023, instruiți 4 angajați (formatori) ai IGSU; 2) curs de instruire pentru paramedici cu efectivul DRCS nr. 2, instruiți 12 angajați. În procesul de elaborare și aprobare a Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025, Acțiunea 4.4.4 "Instruirea formatorilor de paramedici" Indicator de monitorizare „50 formatori de paramedici instruiți” a fost expusă greșit. Instruirea formatorilor de paramedici la moment, poate fi realizată doar în cadrul Centrul Național de Formare

							Formatori al ISU "Horea" al județului Mureș din România. În anul 2023, instruirea unui formator conform planului didactic și de formare includea: 30 zile – instruire teoretică (curs de paramedic); 30 zile – activitate practică pe echipaje de prim ajutor (ambulanțe B2 SMURD); 30 zile – instruire psihopedagogică. Total 90 de zile de instruire și formare. În contextul planului didactic sus menționat, ca calcul estimativ doar a cheltuielilor pentru achitarea diurnelor și serviciilor de cazare în instruirea unui formator ar constitui cca 290 000 lei. Subsidiar celor menționate, mai menționăm că Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nu necesită un număr atât de mare de formatori de paramedici, deoarece prin această acțiune oferta ar depăși cu mult cererea de instruire a paramedicilor. Reieșind din cele expuse, pentru realizarea Acțiunii 4.4.4 și corectitudinea acesteia textul acțiunii urmează a fi modificat în următoarea redacție: <i>Acțiunea 4.4.4 „Instruirea și formarea de paramedici” Indicator de monitorizare ”50 de paramedici instruiți”.</i>
--	--	--	--	--	--	--	---

4. Constatări privind costurile Programului

Potrivit Planului de acțiuni privind implementarea Programului, valoarea estimativă a resurselor financiare necesare realizării obiectivelor, constituie 1 929 898,0 mii de lei, care au fost repartizate pe ani, după cum urmează:

- 2022 – 0 lei;
- 2023 – 608566,0 mii lei;
- 2024 – 661366,0 mii lei;
- 2025 – 659966,0 mii lei.


În conformitate cu pct. 1 lit. f) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 privind Clasificația bugetară (anexa nr. 7), resursele financiare necesare pentru implementarea Programului urmează a fi acoperite de următoarele subprograme:

- *Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor (3702);*
- *Managementul deșeurilor radioactive (7006);*
- *Politici și management al rezervelor materiale ale statului (2701);*
- *Rezerve materiale ale statului (2702);*
- *Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului (2703);*
- *Carabinieri (3504).*

Analiza gradului de finanțare a Programului denotă următoarele cheltuieli:

- din Bugetul de stat au fost alocate 497 419 mii lei, ce constituie 34% din cheltuieli;
- partenerii de implementare au finanțat cu 100 186 mii lei, ce constituie 7%;
- costurile neacoperite au fost estimate la 868 430 mii lei, ce constituie 59% (Graficul nr. 15).

Graficul nr. 15:

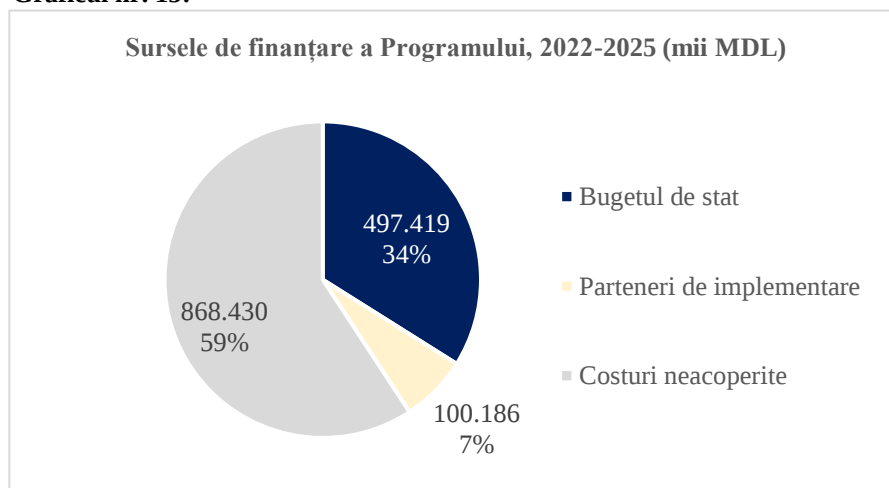

Totodată, analiza gradului de finanțare a Programului după obiective specifice, denotă faptul că cele mai mari cheltuieli din Bugetul de stat au fost realizate la Obiectivul specific 3.4 ”Eficientizarea până în anul 2025 a activității de administrare și consolidare a capacității rezervelor de stat și de mobilizare” (suma de 422 353 mii lei), pe când cel mai finanțat obiectiv specific de către partenerii de implementare a


fost Obiectivul nr. 4.1 ”Crearea până în anul 2025 a condițiilor de muncă de calitate înaltă pentru a stimula creșterea eficienței angajaților din domeniul situațiilor de urgență și excepționale”, suma constituind 64 188 mii lei, iar nivelul cel mai mare de costuri neacoperite s-a referit la Obiectivul specific nr. 4.2 ”Asigurarea până în anul 2025 a condițiilor conforme normelor pentru toate tipurile de intervenții”, suma constituind 510 900 mii lei (Tabelul nr. 15).

Tabel nr. 15 Sursele de finanțare a Programului (2022-2025)


Numărul obiectivului specific	Cheltuieli / Resurse alocate			Gradul de finanțare
	Bugetul de stat	Parteneri de implementare	Costuri neacoperite	
Obiectivul specific 1.1	188	0	16 491	1%
Obiectivul specific 2.1	0	0	110 000	0%
Obiectivul specific 2.2	20	396	6 600	6%
Obiectivul specific 2.3	57	0	0	100%
Obiectivul specific 2.4	0	25	6 100	0%
Obiectivul specific 3.1	22 530	35 127	83 446	41%
Obiectivul specific 3.2	404	450	0	100%
Obiectivul specific 3.3	16 474	0	0	100%
Obiectivul specific 3.4	422 353	0	0	100%
Obiectivul specific 4.1	13 855	64 188	11 418	87%
Obiectivul specific 4.2	21 400	0	510 900	4%
Obiectivul specific 4.3	0	0	123 200	0%
Obiectivul specific 4.4	139	0	275	34%
Total	497 419	100 186	868 430	41%

Din totalul de 81 de acțiuni planificate, au fost finanțate 37 de acțiuni (ce constituie 46%), 15 acțiuni au fost subfinanțate (ce constituie 19%), iar 29 acțiuni rămân a fi nefinanțate (36%) (Graficele nr. 16 și nr. 17).

Graficul nr. 16

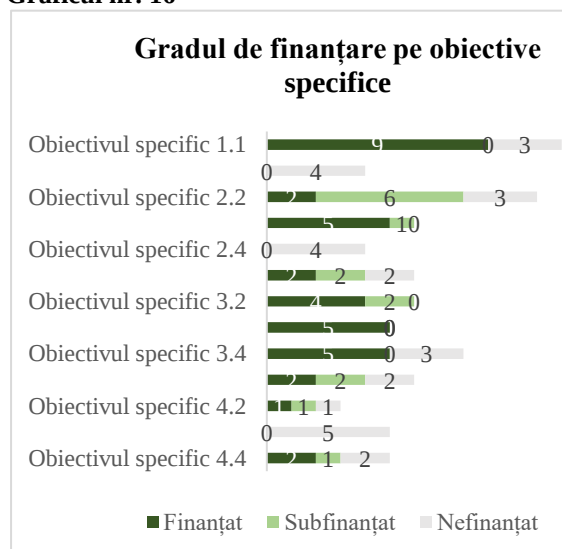


Graficul nr. 17

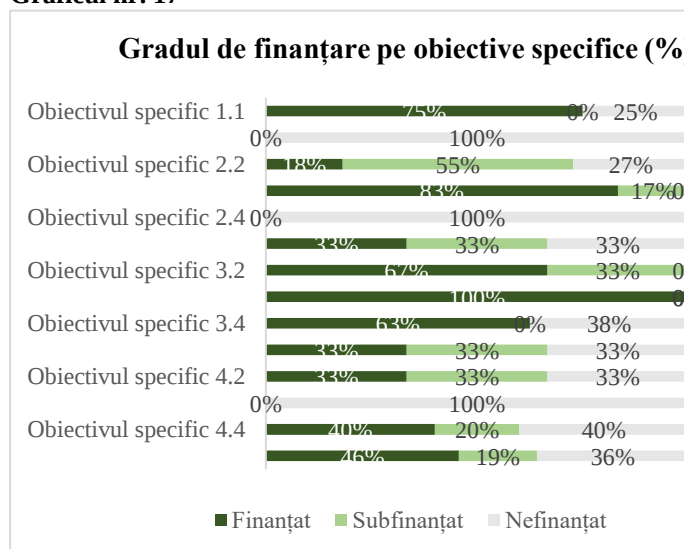


Totodată, analizând gradul de realizare și finanțare a indicatorilor de monitorizare, relevăm următoarea corelație:

- din 10 acțiuni realizate, 5 au fost finanțate (ce constituie 50%), iar alte 5 au avut un grad de subfinanțare (50%);
- din 6 acțiuni nerealizate (progres avansat) 4 au fost finanțate (67%) și 2 nefinanțate (33%);
- acțiunea nerealizată (fără progres) nu a fost finanțată pe parcursul perioadei de raport (100%);
- din totalul de 50 acțiuni care sunt în proces, doar 28 acțiuni au fost finanțate (56%), 10 subfinanțate (20%), iar 12 acțiuni rămân a fi nefinanțate (24%) (Graficele nr. 18 și nr. 19).

Graficul nr. 18

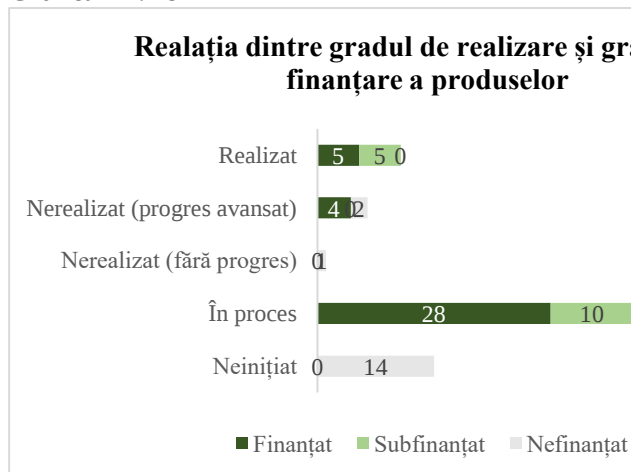

Graficul nr. 19

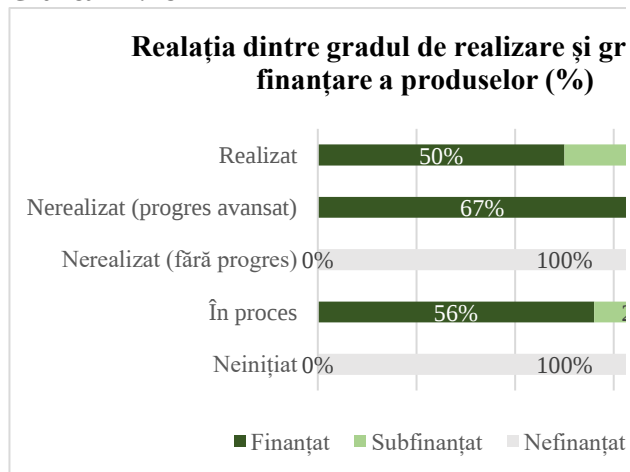

Situația generală privind cheltuielile resurselor alocate în vederea realizării Programului în perioada 2022-2023 pe indicatorii de monitorizare este redată în Tabelul nr. 16

Tabelul nr. 16

Obiectiv specific	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Suma (mii lei) (Bugetul de stat/ de stat)	Cheltuieli/resurse alocate				Gradul de finanțare
				Sursa (Bugetul de stat/ subprogramul)	Suma (mii lei) (parteneri de implementare)	Sursa (parteneri de implementare)	Costuri neacoperite	
1.1. Perfecționarea legislației în domeniul situațiilor de urgență și excepționale	1.1.1. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii voluntariatului nr. 121/2010	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	50,0	37.02	-	-		Finanțat
	1.1.2. Actualizarea integrală a Legii nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor și a Legii nr. 271/1994 cu privire la protecția civilă	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	10	37.02	-	-	-	Finanțat
	1.1.3. Modificarea cadrului normativ referitor la domeniul rețelei naționale de observare și control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanțe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice și agenți biologici	Hotărâre a Guvernului aprobată	10	37.02	-	-	-	Finanțat
	1.1.4. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea în domeniul protecției civile	Hotărâre a Guvernului aprobată	-	37.02	-	-	-	Nefinanțat
	1.1.5. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului și a Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova	Hotărâre a Guvernului aprobată	35,0	37.02	-	-	-	Finanțat

	1.1.6. Elaborarea cadrului normativ pentru reglementarea participării la activități internaționale (misiuni/exerciții)	Hotărâre a Guvernului aprobată	25,0	37.02	-	-	-	Finanțat
	1.1.7. Reglementarea procedurilor de transportare a cetățenilor aflați în dificultate în afara țării, inclusiv în dificultate cu caracter medical	Hotărâre a Guvernului aprobată	33,0	37.02	-	-	-	Finanțat
	1.1.8. Elaborarea și modificarea cadrului normativ pentru reglementarea statutului de paramedic/ recunoașterea studiilor de paramedic	Cadru normativ elaborat și aprobat	5,0	37.02	-	-	-	Finanțat
	1.1.9. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență	Hotărâre a Guvernului aprobată; state de personal ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne suplinite (număr de persoane 123 ²)	-	37.02	-	-	16491	Nefinanțat
	1.1.10. Stabilirea competențelor autorităților publice centrale privind gestionarea situațiilor de urgență și excepționale	Hotărâre a Guvernului aprobată	10,0	37.02	-	-	-	Finanțat
	1.1.11. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1076/2010 cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale	Hotărâre a Guvernului aprobată	10,1	37.02	-	-	-	Finanțat

	1.1.12. Modificarea actelor normative privind atribuirea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne a competențelor de constatare a incendiilor	Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului	-	37.02	-	-	-	Nefinanțat
2.1. Operaționalizarea până în anul 2025 a sistemului național de avertizare timpurie	2.1.1. Elaborarea studiului de fezabilitate a sistemului național de avertizare timpurie	Studiu de fezabilitate și documentație tehnică a sistemului național de avertizare timpurie realizate	-	37.02	-	-	-	Nefinanțat
	2.1.2. Elaborarea conceptului sistemului național de avertizare timpurie	Hotărâre a Guvernului aprobată	-	37.02	-	-	-	Nefinanțat
	2.1.3. Elaborarea Regulamentului de utilizare a sistemului național de avertizare timpurie	Hotărâre a Guvernului aprobată	-	37.02	-	-	-	Nefinanțat
	2.1.4. Dezvoltarea sistemului național de avertizare timpurie a populației	Sistem dezvoltat și funcțional	-	37.02	-	-	110 000,0	Nefinanțat
2.2. Consolidarea activității de comunicare și informare preventivă	2.2.1. Desfășurarea campaniilor de informare și prevenire a situațiilor excepționale	Cel puțin 10 campanii de informare preventivă desfășurate	-	37.02	-	-	-	Subfinanțat
		Cel puțin 100 000 de persoane informate și 30% de localități acoperite	-	37.02	-	-	-	Subfinanțat
		Cel puțin 8 spoturi TV realizate	-	37.02	-	-	-	Subfinanțat
		Cel puțin 20 de materiale diseminate prin intermediul rețelelor de socializare	-	37.02	-	-	-	Subfinanțat

		Cel puțin 4 echipamente tipografice procurate	-	37.02	396,0	Ambasada SUA	-	Subfinanțat
	2.2.2. Elaborarea conceptului de organizare a activității de prevenție	Concept de organizare a activității de prevenire elaborat și aprobat (ordin al ministrului afacerilor interne aprobat)	10,0	37.02	-	-	-	Finanțat
	2.2.3. Crearea etapizată și operaționalizarea modulelor regionale mobile de prevenire	3 module mobile de prevenire operaționale	-	37.02	-	-	6 600,0	Nefinanțat
	2.2.4. Elaborarea metodologiei naționale de evaluare a riscurilor situațiilor de urgență/exceptionale	Hotărâre a Guvernului aprobată	10,0	37.02	-	-	-	Finanțat
		Metodologia existentă la nivel local revizuită	-	37.02	-	-	-	Nefinanțat
		Analiza riscurilor la nivel central și local efectuată	-	37.02	-	-	-	Nefinanțat
	2.2.5. Instruirea copiilor/elevilor în instituțiile de învățământ privind situațiile de risc (riscurile situațiilor de urgență/exceptionale)	Ore obligatorii privind cunoștințe de bază de prevenire a riscurilor și comportament sigur în situații de urgență și exceptionale introduse în curriculumul școlar	-	37.02	-	-	-	Subfinanțat
2.3. Sporirea până în anul 2025 a gradului de integrare și implicare a voluntariatului în viața comunității	2.3.1. Elaborarea conceptului privind activitatea de voluntariat în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență și exceptionale	Concept de dezvoltare a voluntariatului elaborat	10,0	37.02	-	-	-	Finanțat

	2.3.2. Cooperarea cu organele administrațiilor publice centrale, locale, sectorul privat și asociativ în scopul dezvoltării voluntariatului în domeniu	Acorduri de cooperare cu autoritățile publice locale, sectorul privat și asociativ încheiate	7,0	37.02	-	-	-	Finanțat
	2.3.3. Înființarea structurilor de salvatori și pompieri voluntari	Cel puțin 7 posturi de salvatori pompieri voluntari create; personal voluntar identificat și recrutat (70 de persoane)	10,0	37.02	-	-	-	Finanțat
	2.3.4. Dotarea cu autospeciale a posturilor de voluntari	Posturile de voluntari dotate cu autospeciale din contul donațiilor (7 autospeciale)	-	37.02	-	-	-	Subfinanțat
	2.3.5. Instruirea personalului voluntar	Cel puțin 250 de voluntari instruiți	30,0	37.02	-	-	-	Finanțat
2.4. Creșterea calității procesului instituțional de expertiză în prevenirea situațiilor de urgență și excepționale	2.4.1. Dotarea laboratoarelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne cu instalații, utilaj și echipamente	Echipamente, instalații și utilaje pentru activitatea de expertiză procurate (un set)	-	37.02	24,65	Programul de pregătire în domeniul CBNR (C2)	5000,0	Nefinanțat
	2.4.2. Instruirea angajaților în domeniul cercetării cazurilor situațiilor de urgență și excepționale, precum și în domeniul stabilirii indicilor tehnici ai materialelor și elementelor de construcție	Personal profesionist instruit (5 persoane/specialiști)	-	37.02	-	Programul de pregătire în domeniul CBNR (C2)	1000,0	Nefinanțat
	2.4.3. Acreditarea laboratoarelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Corespunderea cu cel puțin 3 standarde de calitate ISO	-	37.02	-	-	100,0	Nefinanțat

		Laboratoare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne acreditate (act de acreditare)	-	37.02	-	-	-	Nefinanțat
3.1. Dezvoltarea capacităților naționale de pregătire și instruire în situații de urgență și excepționale	3.1.1. Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a clădirii Centrului de instruire al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne din satul Răzeni, raionul Ialoveni	Clădirea Centrului de instruire din satul Răzeni reconstruită/renovată	22 387,85	37.02	20 592,51	Programul transfrontalier de cooperare România-Republica Moldova 2014-2020	-	Finanțat
	3.1.2. Înființarea, dotarea și amenajarea poligoanelor de instruire	Poligoane de instruire amenajate (3 poligoane/module)	-	37.02	8 379,70	Programul transfrontalier de cooperare România-Republica Moldova 2014-2020	71 620,30	Subfinanțat
		Echipamente și utilaje de pregătire procurate (3 seturi)	-	37.02	6 154,40	Programul transfrontalier de cooperare România-Republica Moldova 2014-2020	9 845,60	Subfinanțat
	3.1.3. Elaborarea programelor de instruire și a curricula de studii	Cel puțin 12 programe modulare de pregătire și instruire în situații de urgență elaborate	10,0	37.02	-	-	-	Finanțat

	3.1.4. Planificarea și desfășurarea sesiunilor de instruire a personalului de specialitate din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Cel puțin 300 de angajați din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne instruiți	118,3	37.02	-	-	1 000,0	Nefinanțat
	3.1.5. Instruirea angajaților și populației pentru acordarea primului ajutor calificat	Cel puțin 60 de angajați și 200 de persoane instruite pentru acordarea primului ajutor calificat	20,0	37.02	-	-	980,0	Nefinanțat
3.2. Valorificarea oportunităților de participare la instruire/exerciții pe plan internațional	3.2.1. Participarea angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne în cadrul Programului de instruire al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene	Participarea la cel puțin 2 cursuri anual	-	37.02	-	-	-	Finanțat
		Numărul exercițiilor de teren la care s-a participat	110,71	37.02	-	-	-	Finanțat
		Cel puțin 8 angajați instruiți	-	37.02	-	-	-	Finanțat
	3.2.2. Desfășurarea exercițiilor internaționale în Republica Moldova	Cel puțin un exercițiu anual desfășurat; cel puțin 100 de participanți la exerciții	200,0	37.02	450,0	Proiectul UE „Alinierea țărilor politicii europene de vecinătate la Mecanismul de protecție civilă și instrumentele UE prin serii de exerciții (EURO-MED-REACT) Proiectul „Exerciții de	-	Subfinanțat

						masă pentru susținerea națiunii gazde a UE”		
	3.2.3. Participarea și organizarea schimbului de experiență și bune practici	Cel puțin o vizită de studiu desfășurată	93,58	37.02	-	-	-	Finanțat
3.3. Fortificarea capacităților grupurilor-țintă (populației, autorităților administrației publice, sectorului privat, asociativ și voluntar) în gestionarea situațiilor de urgență și excepționale	3.3.1. Elaborarea planurilor de instruire/pregătire în domeniul protecției civile	7 planuri de pregătire pentru fiecare categorie de audienți elaborate	5,0	37.02	-	-	-	Finanțat
	3.3.2. Organizarea și desfășurarea procesului de instruire/pregătire pentru reprezentanții autorităților publice centrale, autorităților publice locale, sectorului privat, asociativ și voluntar	Audienți din cadrul autorităților publice locale, autorităților publice centrale, sectorului privat și asociativ instruiți (minimum 1 500 de persoane anual)	16 435,70	37.02	-	-	-	Finanțat
	3.3.3. Acordarea suportului autorităților publice locale în actualizarea strategiilor și planurilor pentru gestionarea situațiilor de urgență și excepționale	Suport consultativ în elaborarea strategiilor și planurilor pentru gestionarea situațiilor de urgență și excepționale acordat autorităților publice locale	3,0	37.02	-	-	-	Finanțat

		(număr de acte departamentale de suport elaborate, număr de ședințe de lucru desfășurate)						
	3.3.4. Desfășurarea exercițiilor, aplicațiilor practice de protecție civilă cu antrenarea autorităților publice locale, autorităților publice centrale, sectorului privat și asociativ	Cel puțin 10 exerciții, aplicații practice și de Stat Major anual cu antrenarea autorităților publice locale, autorităților publice centrale, sectorului privat și asociativ desfășurate.	30,0	37.02	-	-	-	Finanțat
		Cel puțin 400 de persoane antrenate	30,0	37.02	-	-	-	Finanțat
3.4. Eficientizarea până în anul 2025 a activității de administrare și consolidare a capacității rezervelor de stat și de mobilizare	3.4.1. Ajustarea cadrului normativ în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare	Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare elaborat și aprobat de Guvern	40,0	37.02	-	-	-	Finanțat
		Nomenclatoarele bunurilor materiale din rezervele de stat și rezervele de mobilizare actualizate și aprobate de Guvern	20,0	27.02	-	-	-	Finanțat
	3.4.2. Completarea rezervelor de stat și de mobilizare cu bunuri materiale corespunzătoare necesităților de intervenție în situații de urgență/excepționale și de recuperare	Nivelul de completare a rezervelor de stat cu cel puțin 8% anual	416 688,90	27.02	-	-	-	Finanțat

		Nivelul de completare a rezervelor de mobilizare cu cel puțin 8 % anual	2 436,10	27.02	-	-	-	Finanțat
	3.4.3. Dezvoltarea infrastructurii depozitelor Agenției Rezerve Materiale	Depozite din gestiunea Agenției Rezerve Materiale reparate	3 167,50	37.02	-	-	-	Finanțat
		Bază de produse petroliere cu capacitatea de păstrare a unui volum de 30 mii de tone construită	-	-	-	-	-	Nefinanțat
	3.4.4. Instruirea angajaților Centrului de gestionare a rezervelor materiale ale statului în scopul eliberării operative a bunurilor în situații excepționale/de urgență	Plan operativ de intervenții privind eliberarea bunurilor în situații excepționale/de urgență elaborat	-	-	-	-	-	Nefinanțat
		2 antrenamente, cu generalizarea rezultatelor acestora, efectuate	-	-	-	-	-	Nefinanțat
4.1. Crearea până în anul 2025 a condițiilor de muncă de calitate înaltă pentru a stimula creșterea eficienței angajaților din domeniul situațiilor de urgență și excepționale	4.1.1. Revizuirea analizei/conceptului de dezvoltare a domeniului intervențiilor/de răspuns	Analiza/conceptul revizuit(ă) și aprobat(ă) prin ordin al ministrului afacerilor interne	-	37.02	-	-	-	Nefinanțat

	4.1.2. Renovarea structurilor/sediilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	2 structuri/sedii renovate anual	1 581,60	37.02	13 816,60	Programul transfrontalier de cooperare România-Republica Moldova 2014-2020	4418,40	Subfinanțat
	4.1.3. Reconstruirea și/sau construirea sediilor de salvatori și pompieri	6 remize de salvatori și pompieri construite/reconstruite	5 160,40	37.02	50 371,40	Ambasada SUA în Republica Moldova Programul transfrontalier de cooperare România-Republica Moldova 2014-2020	-	Finanțat
	4.1.4. Operaționalizarea structurilor de salvatori și pompieri construite/înființate	Număr de echipamente și utilaje procurate	1 083,30	37.02	-	-	-	Finanțat
	4.1.5. Securizarea energetică a structurilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne	Cel puțin 5 structuri securizate I	6 029,40	37.02	-	-	7000,0	Subfinanțat
	4.1.6. Antrenarea voluntarilor în misiunile de intervenție	Cel puțin 120 de voluntari antrenați în misiuni de intervenție	-	37.02	-	-	-	Nefinanțat
4.2. Asigurarea până în anul 2025 a condițiilor conforme normelor pentru toate tipurile de intervenții	4.2.1. Procurarea autospecialelor de intervenție	58 de autospeciale procurate (49 de autocisterne și 9 autoscări)	-	37.02	-	-	510 400,0	Nefinanțat

	4.2.2. Procurarea echipamentelor de protecție	Echipamente de protecție procurate (120 de seturi anual)	19 400,0	37.02	-	-	-	Finanțat
	4.2.3. Procurarea echipamentelor de suport logistic pentru misiuni externe	Echipamente de suport logistic procurate (un set)	2000,0	37.02	-	-	500,0	Subfinanțat
4.3. Dezvoltarea capacității de furnizare a asistenței internaționale în materie de protecție civilă	4.3.1. Operaționalizarea modului de pompare de mare capacitate	Modul de pompare de mare capacitate operaționalizat (număr de angajați instruiți, număr de echipamente procurate)	-	37.02	-	-	11 000,0	Nefinanțat
	4.3.2. Operaționalizarea modului USAR (Urban Search and Rescue)	Modul USAR (Urban Search and Rescue) operaționalizat (număr de cursuri de pregătire realizate, număr de persoane instruite, număr de dotări procurate)	-	37.02	-	-	61 000,0	Nefinanțat
	4.3.3. Operaționalizarea submodulului de suport logistic pentru realizarea misiunilor externe	Submodul de suport logistic creat (număr de angajați instruiți, număr de echipamente procurate)	-	37.02	-	-	39 600,0	Nefinanțat
	4.3.4. Operaționalizarea echipei de asistență și suport tehnic	Echipă de asistență și suport tehnic creată și dotată cu echipamente	-	37.02	-	-	11 000, 0	Nefinanțat
	4.3.5. Crearea rezervei naționale de experți în protecție civilă	Cel puțin 8 persoane identificate și instruite	-	37.02	-	-	-	Nefinanțat
4.4. Sporirea până în anul 2024 a rezilienței la situații care pun	4.4.1. Elaborarea și aprobarea unui ordin comun al ministrului afacerilor interne și ministrului sănătății privind stabilirea competențelor și atribuțiilor	Ordin comun elaborat și aprobat	-	37.02	-	-	-	Nefinanțat

în pericol sănătatea oamenilor	echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească							
	4.4.2. Elaborarea regulamentelor și a procedurilor de cooperare a serviciilor medicale de urgență naționale cu SMURD	Cel puțin un regulament și 2 proceduri de cooperare a serviciilor medicale de urgență naționale cu SMURD aprobate	10,0	37.02	-	-	-	Finanțat
	4.4.3. Ajustarea de comun cu Ministerul Sănătății a procedurilor și mecanismelor necesare privind antrenarea echipajelor SMURD la apelurile de urgență ale cetățenilor pentru acordarea primului ajutor calificat	Proceduri și mecanisme necesare privind antrenarea echipajelor SMURD la apelurile de urgență ale cetățenilor pentru acordarea primului ajutor calificat, ajustate în comun cu Ministerul Sănătății	30,0	37.02	-	-	-	Finanțat
		Număr de intervenții desfășurate în acordarea serviciilor de prim ajutor medical calificat cetățenilor	98,8	37.02	-	-	-	Nefinanțat
	4.4.4. Instruirea formatorilor de paramedici	50 de formatori de paramedici instruiți	-	37.02	-	-	275,0	Subfinanțat

5. Concluzii și recomandări:

În concluzie, analiza ritmului privind gradul de realizare a indicatorilor de impact constată că din cele 4 obiective generale ale Programului, trei **Obiectivele generale (1, 2 și 3)** au înregistrat o dinamică pozitivă a impactului produs, fiind apreciate cu statutul de **conform planului** a indicatorului planificat. Indicatorul de impact pentru **Obiectivul general 4** a fost apreciat ca fiind în **întârziere**

Astfel, în perioada de raport Programul, în mare parte, a realizat acțiunile planificate, fapt demonstrat că 69,2% din rezultate au fost realizate conform planului sau au depășit indicatorii planificați.

La Obiectivele generale 1, 3 și 4 a fost înregistrat cel mai bun nivel de realizare a obiectivelor specifice, cu rezultatele pentru toți indicatorii stabiliți **conform planului**.

Cu toate acestea, unele obiective specifice prevăzute pentru Obiectivul general 2 nu au înregistrat progres sau au avut un progres minim. La Obiectivul general 4 a fost înregistrat un nivel redus de realizare a obiectivelor specifice, fiind stabilit un nivel de realizare prin **întârziere**.

Cât privește gradul de realizare a produselor pentru întreaga perioadă de implementare a Programului (2022-2025), din totalul de **81 de indicatori de monitorizare planificați**, la finele anului 2023, au fost realizați 10 indicatori (**12%**), 6 indicatori sunt **nerealizați**, (cu **progres avansat (7%)**), 1 indicator este **nerealizat (fără progres) (1%)**, 50 de indicatori sunt **în proces** de realizare (**61%**), iar 14 – rămân **neinițiați (17%)**.

Referitor la finanțarea realizării acțiunilor planificate, relevăm faptul că, proveniența surselor în mare parte este din bugetul de stat, majoritatea dintre acestea constituind remunerarea salarială a angajaților, precum și resurse provenite din alocațiile partenerilor de dezvoltare / implementare.

Este de menționat faptul că, impactul determinat de implementarea Programului este dificil de apreciat, deoarece la unele obiective nu este o logică între rezultatele scontate și indicatorii de progres indicați. La fel, la unii indicatori de monitorizare nu este clară formula de calcul a valorii de referință indicată în anul 2022. Toate acestea, generează impedimente în evaluarea exactă a gradului de impact a Programului.

În perioada de raport, din totalitatea de 9 acțiuni planificate cu termen de realizare finele anului 2023, au fost realizate 3 acțiuni, respectiv 6 acțiuni nu au fost finalizate conform termenului stabilit (acțiunile 1.1.9, 2.1.1, 2.2.2, 2.3.1 și 3.4.1). Acțiunile nerealizate, în mare parte, se referă la îmbunătățirea cadrului normativ în domeniu, iar tergiversarea realizării acestora ține de existența unor obiecții și reticență.

În context se accentuează că, numărul total al indicatorilor neinițiați pentru implementarea Programului sectorial enunțat, constituie **17,3%**.

Respectiv, nerealizarea indicatorilor sporește riscul ca politicile să nu atingă impactul planificat, precum și atingerea obiectivelor de dezvoltare ale Programului, care sunt raliat la obiectivele vizând prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență din SDDAI a MAI.

Riscul major care duce la nerealizarea indicatorilor este că, finanțarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului se efectuează din contul și în limitele

mijloacelor prevăzute anual în bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ceea ce nu acoperă costurile planificate. Adicional, se examinează posibilitatea identificării surselor externe de finanțare pentru realizarea integrală a activităților planificate.

De asemenea, ținem să menționăm și unii factori care au influențat atingerea țintei pentru fiecare indicator, și anume:

- Suplimentarea bugetelor actuale: Se referă la disponibilitatea resurselor financiare pentru a putea implementa măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor;

- Elaborarea cadrului normativ: Acest factor include implementarea unor noi legi sau modificarea celor existente pentru a permite implementarea unor soluții sau politici sustenabile;

- Sprijinul partenerilor de dezvoltare: Se referă la importanța ajutorului internațional, a investițiilor străine directe, a organizațiilor non-guvernamentale sau a altor parteneri în atingerea obiectivelor;

- Factori ne antropogeni: Acest factor se referă la evenimentele naturale sau alte forțe externe care pot afecta atingerea obiectivelor. Acesta poate include schimbările climatice, situații de urgență și excepționale, care nu pot fi controlate direct de oameni sau prognozate din timp.

În mod prioritar activitățile autorităților implicate în realizarea Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025, se vor axa pe aspectele, care sunt neexecutate din anii precedenți și care sunt în curs de realizare, în conformitate cu necesitățile actuale, fiind reflectate în Planurile de activitate ale instituțiilor implicate.

Astfel, întru realizarea eficientă a obiectivelor planificate, **se recomandă**:

- Ținând cont de faptul că la unele obiective nu sunt clari indicatorii de impact și formula de calcul a valorii de referință stabilită în 2022, la următoarea evaluare a se ține cont de datele prezentate în prezenta evaluare intermediară și formula de calcul utilizată în prezent, pentru a putea aprecia impactul determinat de implementarea Programului;

- Revizuirea acțiunilor planificate pentru realizare în următoarea perioadă, inclusiv cele nerealizate în termenul stabilit, cu includerea acestora în documentele de planificare pentru următoarea perioadă strategică;

- Responsabilizarea subdiviziunilor/instituțiilor responsabile de implementarea Programului în vederea corelării informației prezentate cu indicatorii de impact.
